

令和7年 6月定例会  
環境経済常任委員会  
提出資料 農商工部

令和7年 6月定例会

環境経済常任委員会 説明資料

(P D C Aサイクルの事業進捗報告)

ため池防災・減災事業

農商工部

環境経済常任委員会 P D C Aサイクルの事業進捗報告について

事業名：ため池防災・減災事業

■常任委員会への報告フロー

令和5年12月定例会	事業概要の説明 令和5年度事業進捗の報告
令和6年3月定例会	令和5年度事業進捗の報告
令和6年6月定例会	令和5・6年度の事業進捗報告
令和6年9月定例会	令和6年度の事業進捗・発注状況報告
令和6年12月定例会	令和6年度事業進捗の報告
令和7年3月定例会	令和6年度事業進捗の報告




令和7年6月定例会	令和6年度事業進捗の報告
-----------	--------------

■6月定例会 説明骨子

令和6年度事業進捗の報告

## 事業箇所位置図

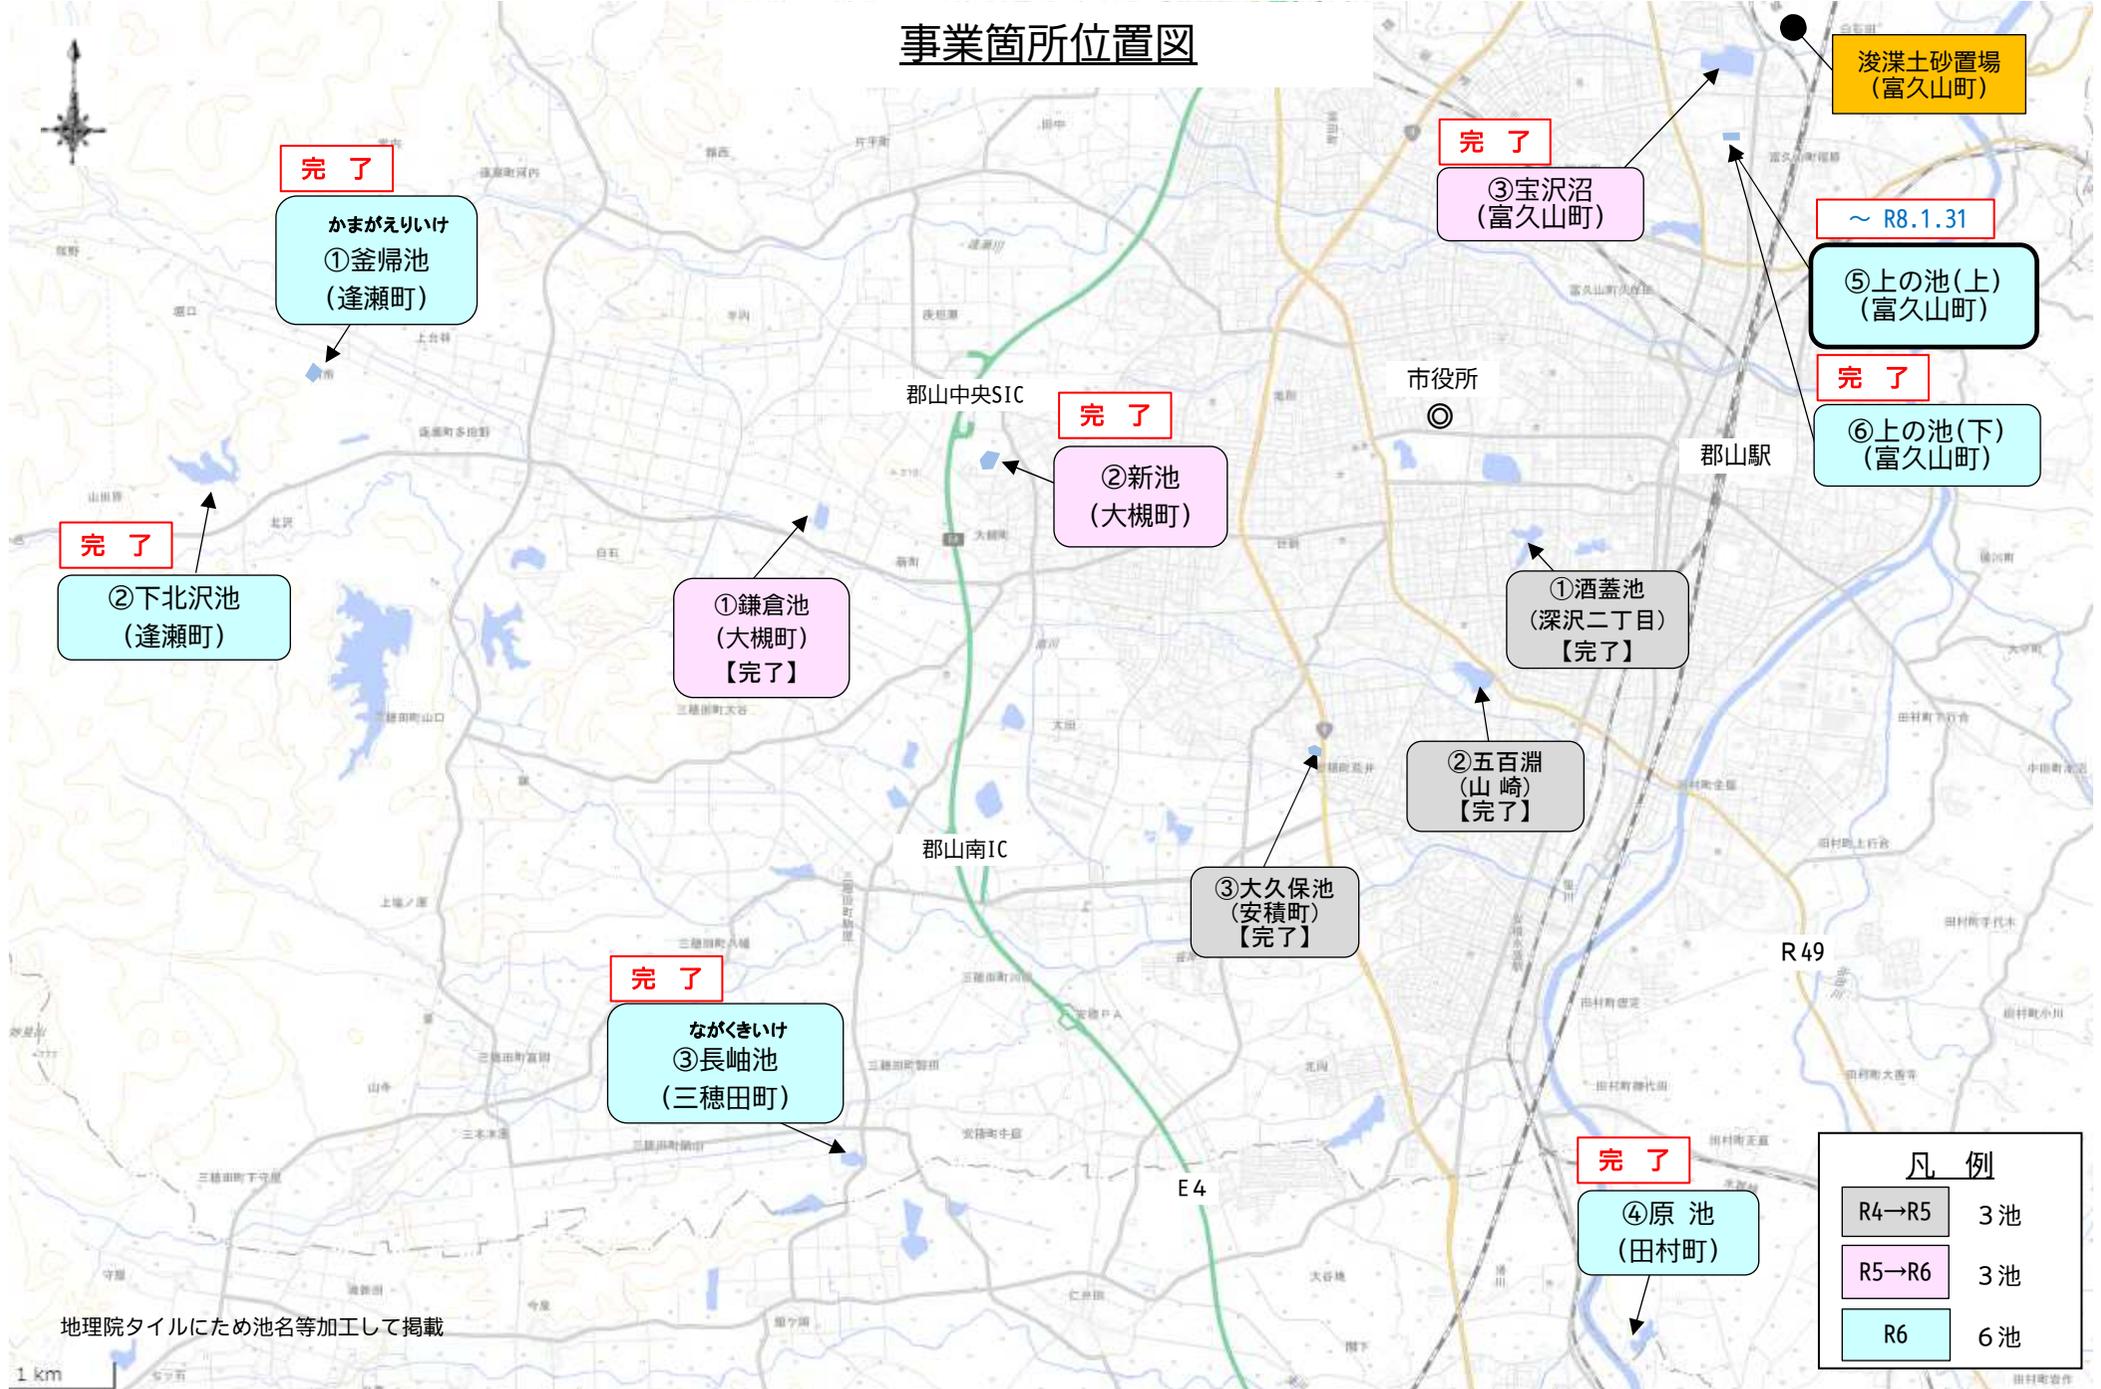

地理院タイルにため池名等加工して掲載

1 km

# ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

資料2

令和5(2023)・6(2024)年度の継続事業


## ② ため池防災・減災事業 (新池) 対策工事

完了

契約番号	第 2023002577号	工程表	R 5年度			R 6年度														
施工箇所	大槻町字中ノ平南	準備工	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
工期	R5.10.10~R7.3.17	仮設工																		
契約金額(変更)	¥341,792,000(361,496,300)	浚渫工																		
受注者	小柳・三栄 特定建設工事共同企業体	放流 施設工																		
工事概要	施工面積 A=27,160㎡	跡片付																		
	浚渫工 V=18,200㎡ 放流施設工N=1基																			
進捗状況	100% (R7年3月)																			

航空写真

対策計画図

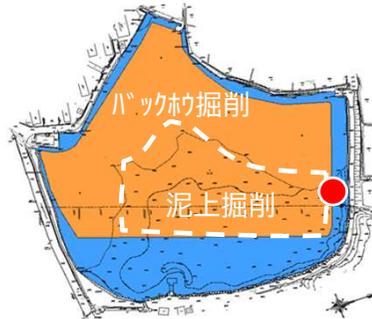

施工状況




## ③ ため池防災・減災事業 (宝沢沼) 対策工事

完了

契約番号	第 2023002589号	工程表	R 5年度			R 6年度														
施工箇所	富久山町福原	準備工	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
工期	R5.10.10~R7.3.17	仮設工																		
契約金額(変更)	¥748,678,700(757,271,900)	浚渫工																		
受注者	壁巢・森尾興発 特定建設工事共同企業体	放流 施設工																		
工事概要	施工面積 A=43,740㎡	跡片付																		
	浚渫工 V=16,000㎡ 放流施設工N=1基																			
進捗状況	100% (R7年3月)																			

航空写真

対策計画図

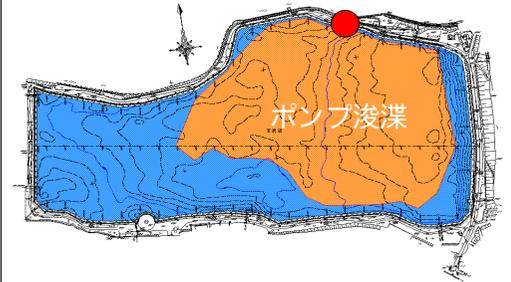

施工状況



# ため池防災・減災事業(P D C A 進捗状況報告)

資料 3

令和 5 (2023) ・ 6 (2024) 年度の継続事業

## ① ため池防災・減災事業 (釜淵池) 対策工事 完了

契約番号	第 2024003199号	工程表	R 6 年度				R 7 年度													
施工箇所	逢瀬町多田野	準備工	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
工期	R6.9.24~R7.5.30	仮設工																		
契約金額	¥42,929,700	浚渫工																		
受注者	壁巢建設株式会社	放流施設工																		
工事概要	施工面積 A=3,100㎡	跡片付																		
	浚渫工 V=1,550㎡																			
進捗状況	100% (R7年5月)																			


## ② ため池防災・減災事業 (下北沢池) 対策工事 完了

契約番号	第 2024003164号	工程表	R 6 年度				R 7 年度													
施工箇所	逢瀬町多田野	準備工	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
工期	R6.9.24~R7.3.14	仮設工																		
契約金額	¥11,334,400	放流施設工																		
受注者	株式会社小川重工業	跡片付																		
工事概要	放流施設工N=1基																			
進捗状況	100% (R7年3月)																			

航空写真



対策計画図

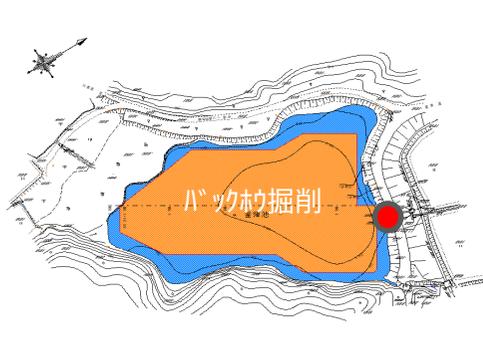

航空写真



放流施設 設置箇所



施工状況


※浚渫土砂は運搬距離と搬出量を考慮し、経済比較により逢瀬町河内の民間受入地に搬出



施工状況



放流施設 計画図

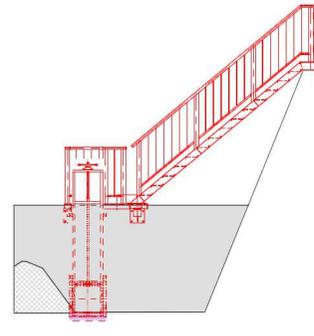

施工状況



# ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

資料4

## 令和6(2024)年度の事業

### ③ ため池防災・減災事業 (長岫池) 対策工事 完了


契約番号	第 2024002871号	工程表	R 6年度												R 7年度																	
施工箇所	三穂田町野田	準備工	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
工期(変更)	R6.9.6~R7.3.14(3.24)	仮設工	[Gantt Chart]												[Gantt Chart]																	
契約金額(変更)	¥121,238,700(126,911,400)	浚渫工	[Gantt Chart]												[Gantt Chart]																	
受注者	壁巢建設株式会社	跡片付	[Gantt Chart]												[Gantt Chart]																	
工事概要	施工面積 A=7,400㎡ 浚渫工 V=3,810㎡		[Gantt Chart]												[Gantt Chart]																	
進捗状況	100% (R7年3月)		[Gantt Chart]												[Gantt Chart]																	

### ④ ため池防災・減災事業 (原池) 対策工事 完了

契約番号	第 2024002380号	工程表	R 6年度												R 7年度																	
施工箇所	田村町御代田	準備工	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
工期(変更)	R6.8.23~R7.3.14(4.11)	仮設工	[Gantt Chart]												[Gantt Chart]																	
契約金額(変更)	¥31,259,800(33,750,200)	放流施設工	[Gantt Chart]												[Gantt Chart]																	
受注者	みほた建設株式会社	跡片付	[Gantt Chart]												[Gantt Chart]																	
工事概要	放流施設工N=1基		[Gantt Chart]												[Gantt Chart]																	
進捗状況	100% (R7年4月)		[Gantt Chart]												[Gantt Chart]																	

航空写真

対策計画図

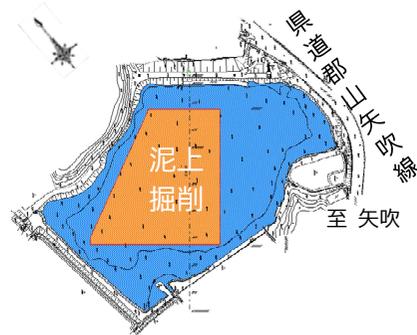


施工状況

施工状況




航空写真

対策計画図

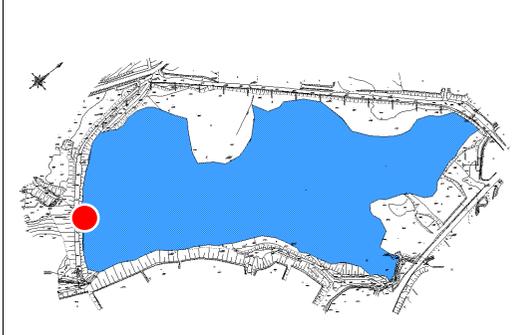

放流施設 計画図

施工状況

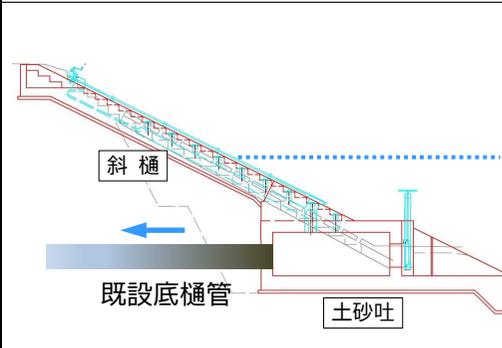



## 浚渫土砂置場 (富久山町福原地内・市有地)



施工年度	対策ため池	土砂置場	民間受入地
R4→5	酒蓋池	16,030	
	五百淵	6,530	
	大久保池	9,290	
R5→6	鎌倉池	7,047	
	新池	18,200	
	宝沢沼	16,000	
R6	長岫池	3,810	
	釜帰池		1,550
	上の池(上)	0	
合計	82,997 (予定)	76,907	1,550
