

下水道管理センター雨水ポンプ増設工事(機械) 工事状況

令和4年2月末 進捗率 約99%


2月は、No.3雨水ポンプに係る各種配管設置を行い、各種配管の気密テスト等を行いました。
3月は、No.3雨水ポンプの総合試運転等を行い、雨水ポンプ増設工事(機械)が完了する見込みです。




各種配管(排ガス管、No.3消音機)設置完了状況



各種配管気密テスト状況

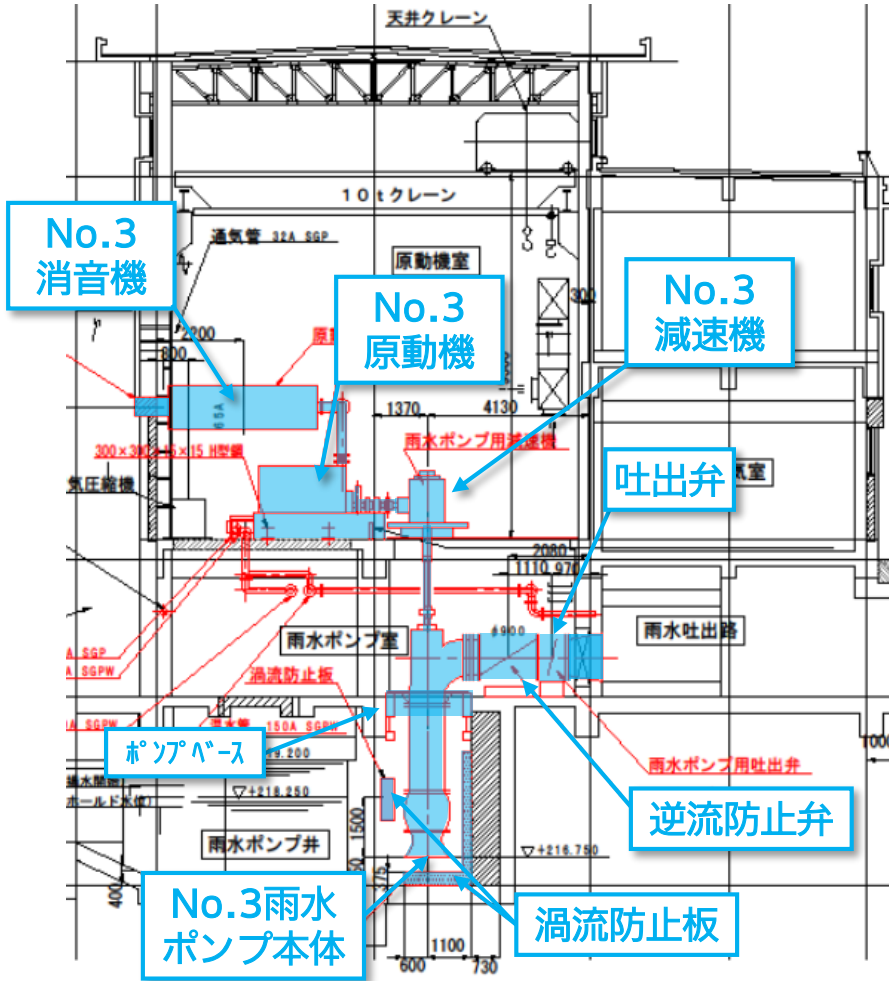

断面図(1階・地下1階・地下2階)

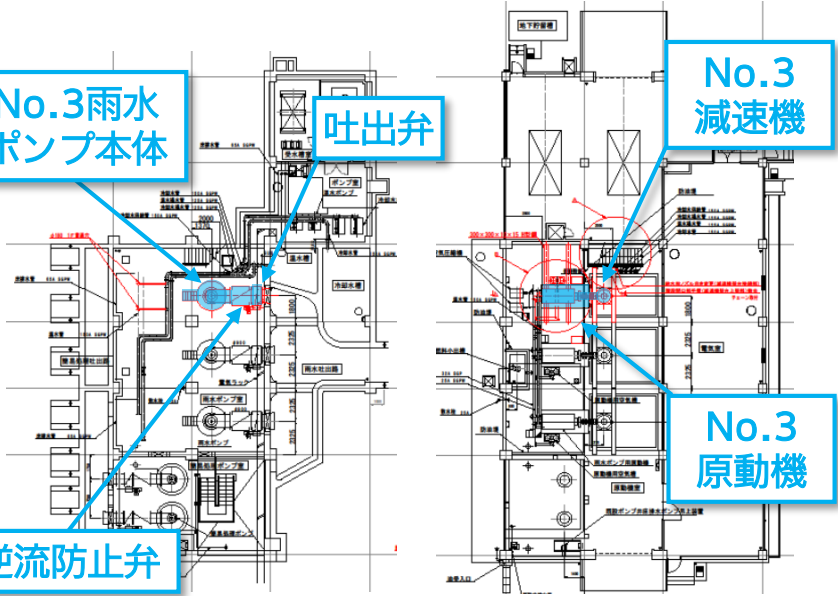

平面図(地下1階)

平面図(1階)
