

令和6年3月定例会

環境経済常任委員会 説明資料

(P D C Aサイクルの事業進捗報告)

ため池防災・減災事業

環境経済常任委員会 P D C Aサイクルの事業進捗報告について

事業名：ため池防災・減災事業

■常任委員会への報告フロー（案）

| | |
|--------|-----------------------|
| 12月定例会 | 事業概要の説明及び令和5年度事業進捗の報告 |
|--------|-----------------------|



| | |
|-------|--------------|
| 3月定例会 | 令和5年度事業進捗の報告 |
|-------|--------------|




| | |
|-------|---------------|
| 6月定例会 | 令和5年度末事業進捗の報告 |
|-------|---------------|

■3月定例会 説明骨子

- 1 令和5年度の事業進捗
進捗状況、施工状況など

農 林 部

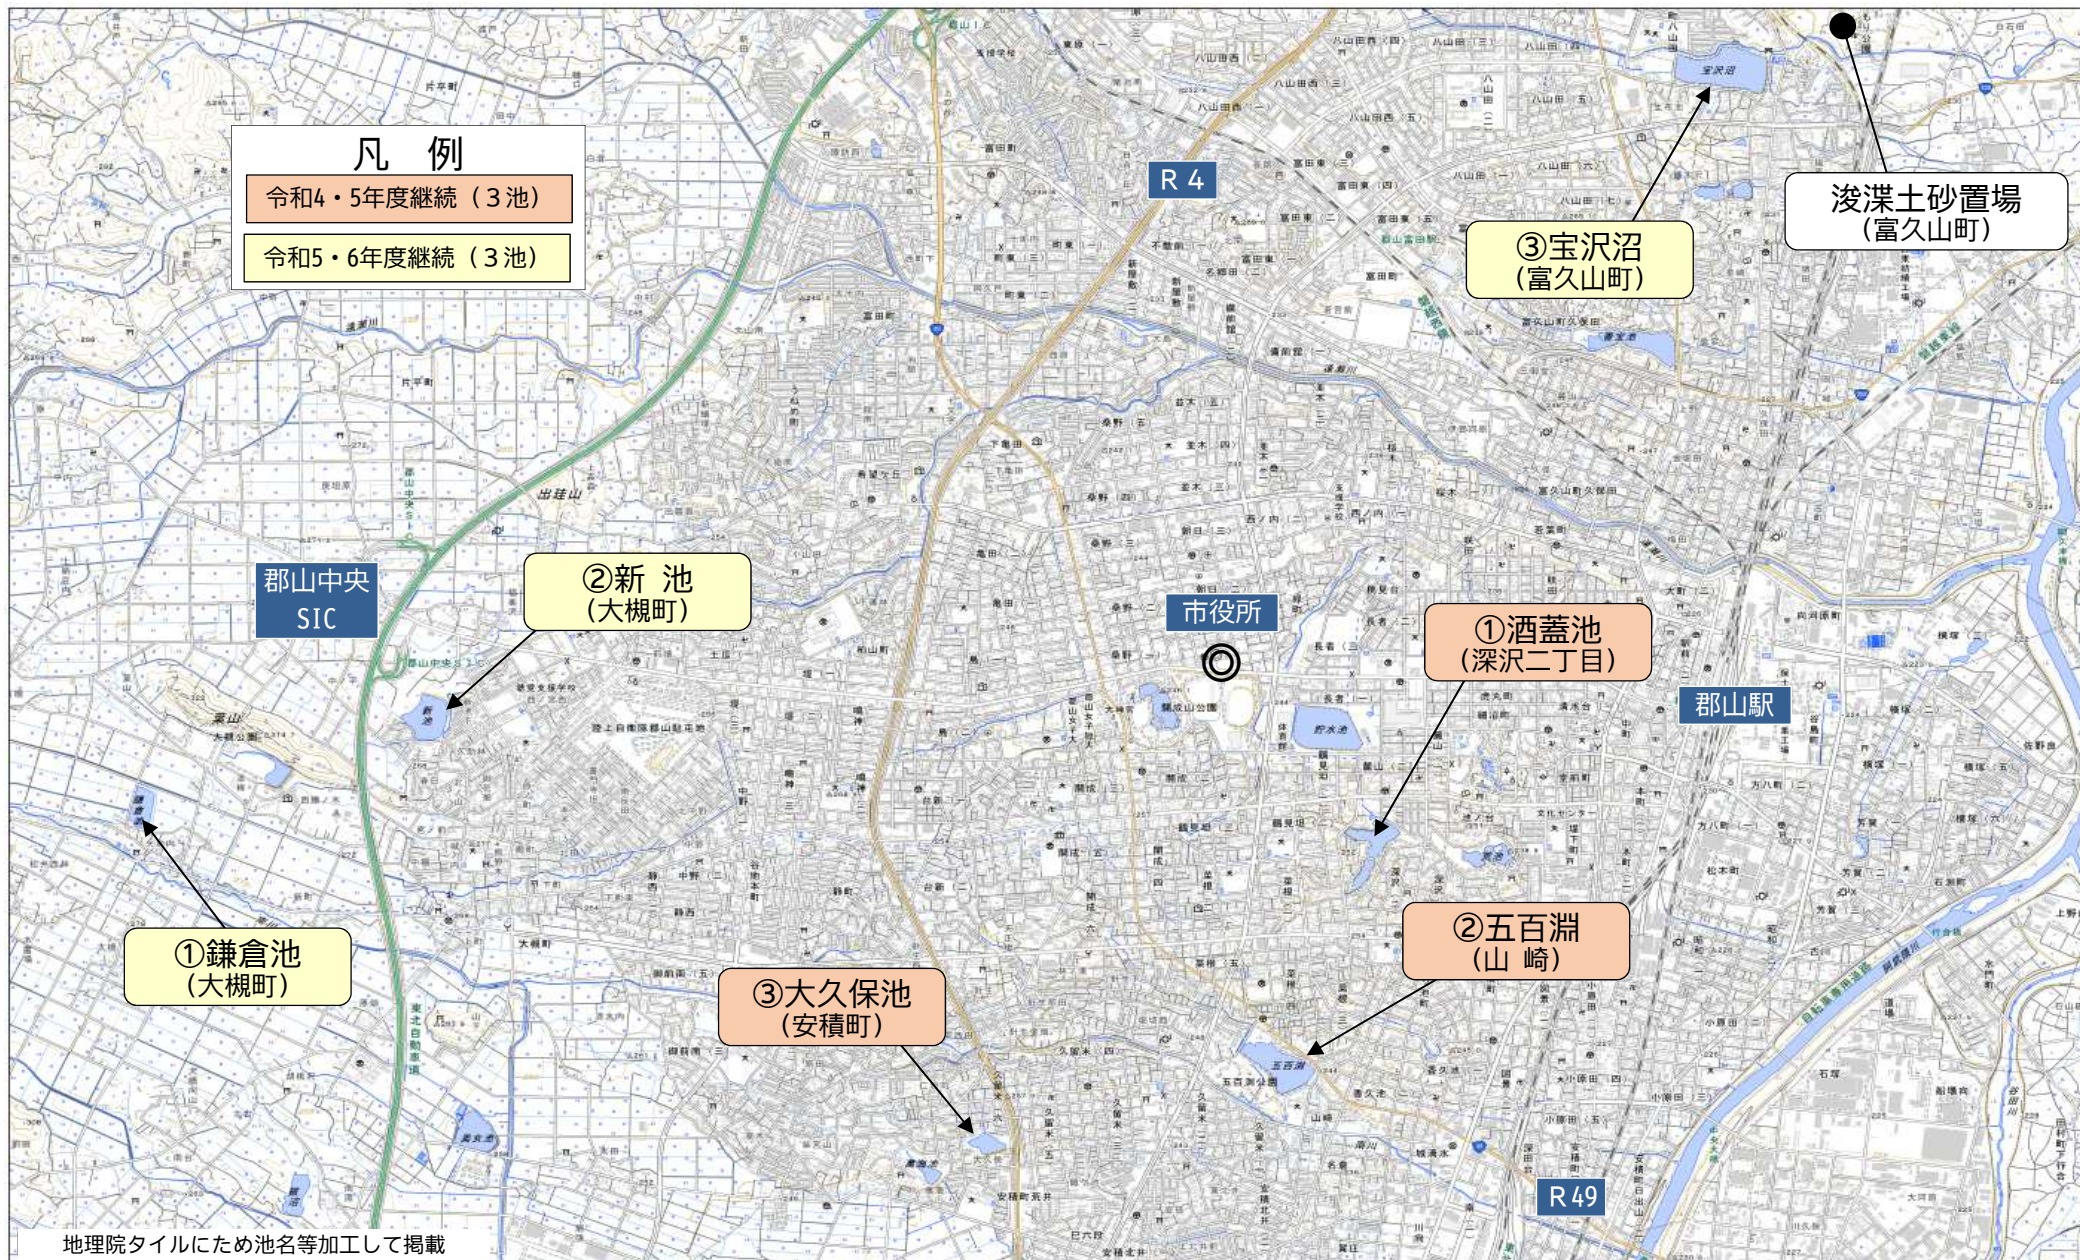

令和4(2022)・5(2023)年度の継続事業

凡例

浚渫箇所

対策不要

● 放流施設

— 計画


— 実施済

●●●● 実施予定

| | | |
|--------------|----------------------|-----------|
| 工事名 | ①ため池防災・減災事業(酒蓋池)対策工事 | |
| 契約番号 | 第 2022004667号 | |
| 施工箇所 | 深沢二丁目 | |
| 工期(変更) | R4.12.16~R6.3.26 | |
| 契約金額(変更) | ¥805,615,800 | |
| 受注者 | 石橋・椎根 特定建設工事共同企業体 | |
| 工事概要 (変更) | 施工面積 | A=29,550㎡ |
| | 浚渫工 | V=16,030㎡ |
| | 放流施設工 | N=2基 |
| 進捗状況 | 95% (R6年2月末) | |



対策計画図

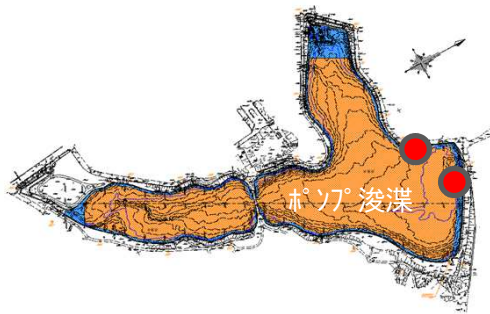

| 工程表 | R4年度 | | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|
| | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 準備工 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工 | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 浚渫工 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 放流施設工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 跡片付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |



脱水後の土砂



令和4(2022)・5(2023)年度の継続事業

凡例

浚渫箇所

対策不要


● 放流施設

—— 計画

—— 実施済

..... 実施予定

| | | |
|----------|----------------------|-----------|
| 工事等名 | ②ため池防災・減災事業(五百淵)対策工事 | |
| 契約番号 | 第 2022004665号 | |
| 施工箇所 | 字山崎 | |
| 工期(変更) | R4.12.16~R6.3.26 | |
| 契約金額(変更) | ¥368,581,400 | |
| 受注者 | 小柳・三栄 特定建設工事共同企業体 | |
| 工事概要 | 施工面積 | A=31,800㎡ |
| | 浚渫工 | V=6,530㎡ |
| | 放流施設工 | N=1基 |
| 進捗状況 | 95% (R6年2月末) | |

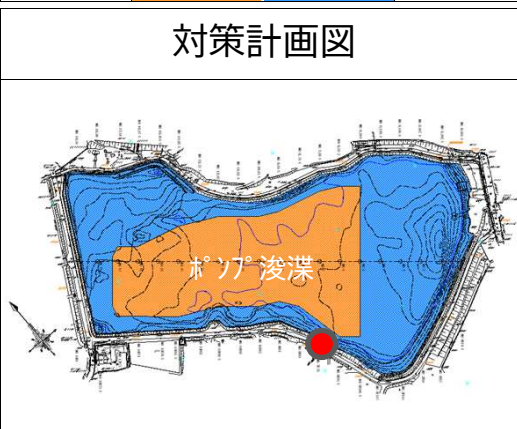

| 工程表 | R4年度 | | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--|
| | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 準備工 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浚渫工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放流施設工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 跡片付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

令和4(2022)・5(2023)年度の継続事業

凡例

浚渫箇所


対策不要

—— 計画


—— 実施済

..... 実施予定

| | | |
|----------|-----------------------|-----------|
| 工事等名 | ③ため池防災・減災事業(大久保池)対策工事 | |
| 契約番号 | 第 2022004664号 | |
| 施工箇所 | 安積町荒井 | |
| 工期 | R4.12.16~R6.3.15 | |
| 契約金額(変更) | ¥378,898,300 | |
| 受注者 | 壁巢・八光 特定建設工事共同企業体 | |
| 工事概要 | 施工面積 | A=12,900㎡ |
| | 浚渫工 | V=9,290㎡ |
| 進捗状況 | R6.2.26 竣工 | |

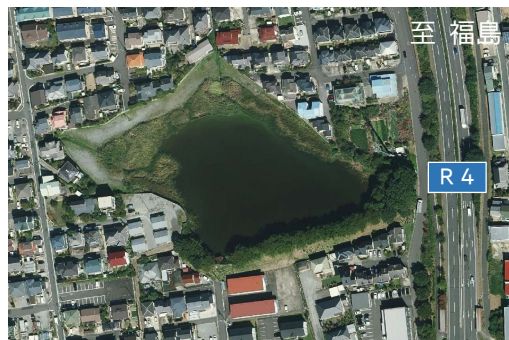


対策計画図

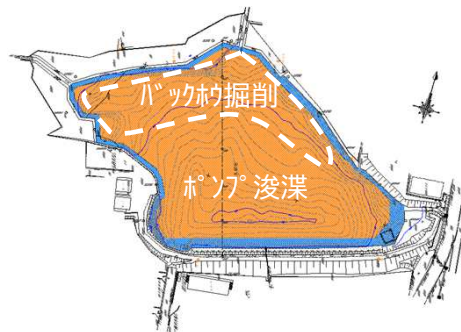

| 工程表 | R4年度 | | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|------|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|
| | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 準備工 | | | —— | —— | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工 | | | | | | —— | —— | | | | | | | | | | | |
| 浚渫工 | | | | | | | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | | |
| 跡片付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | —— |



浚渫土砂置場 (富久山町福原地内・市有地) 置場容量 約8万m³

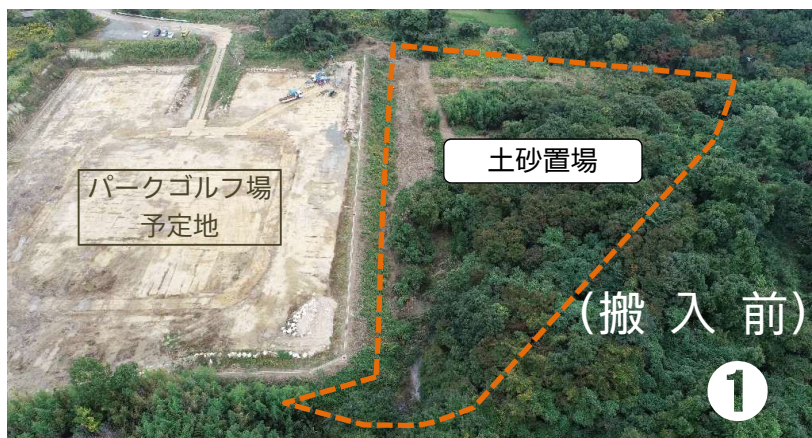

※ 搬入土量31,850m³ (面積1万m²・盛土高さ3m) 25mプール 約50杯相当
