

令和7年3月定例会

環境経済常任委員会 説明資料

(P D C Aサイクルの事業進捗報告)

た め 池 防 災 ・ 減 災 事 業

農 林 部

環境経済常任委員会 P D C Aサイクルの事業進捗報告について

事業名：ため池防災・減災事業

■常任委員会への報告フロー


令和5年12月定例会	事業概要の説明 令和5年度事業進捗の報告
令和6年3月定例会	令和5年度事業進捗の報告
令和6年6月定例会	令和5・6年度の事業進捗報告
令和6年9月定例会	令和6年度の事業進捗・発注状況報告
令和6年12月定例会	令和6年度事業進捗の報告



令和7年3月定例会	令和6年度事業進捗の報告
-----------	--------------

■3月定例会 説明骨子

令和6年度の事業進捗状況


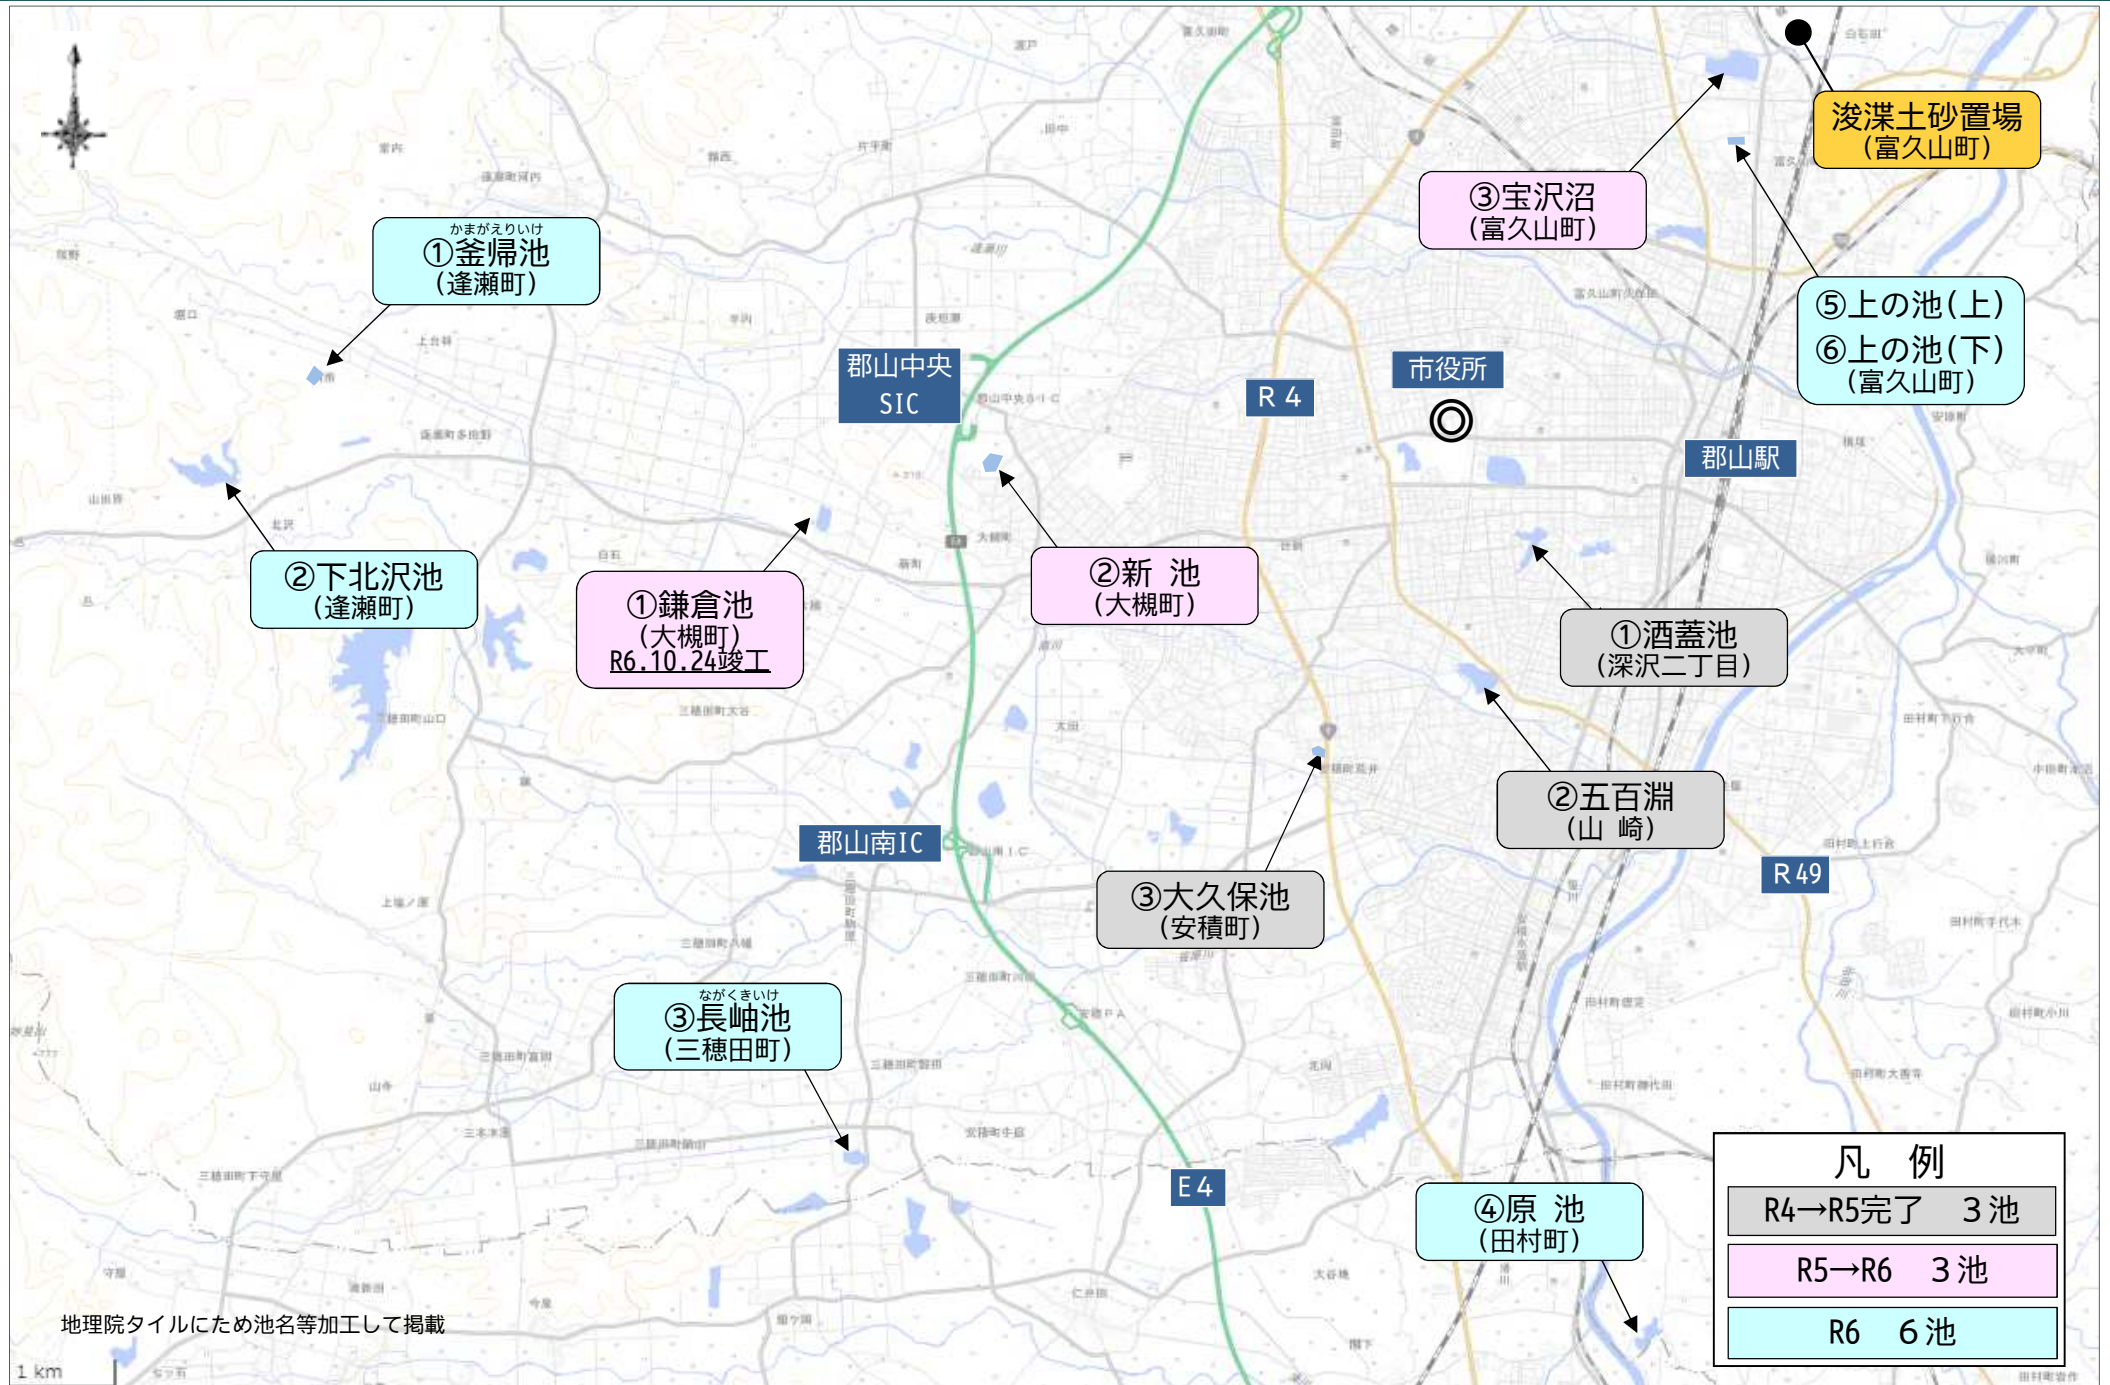


ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

令和5(2023)・6(2024)年度の継続事業

②ため池防災・減災事業(新池)対策工事



契約番号	第 2023002577号	工程表	R 5 年度						R 6 年度											
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
施工箇所	大槻町字中ノ平南	準備工																		
工 期	R5.10.10～R7.3.17	仮設工																		
契約金額(変更)	¥341,792,000(361,496,300)	浚渫工																		
受注者	小柳・三栄 特定建設工事共同企業体	放流 施設工																		
工事概要	施工面積 A=27,160㎡ 浚渫工 V=18,200㎡ 放流施設工N=1基	跡片付																		
進捗状況	95% (R7年2月末)																			

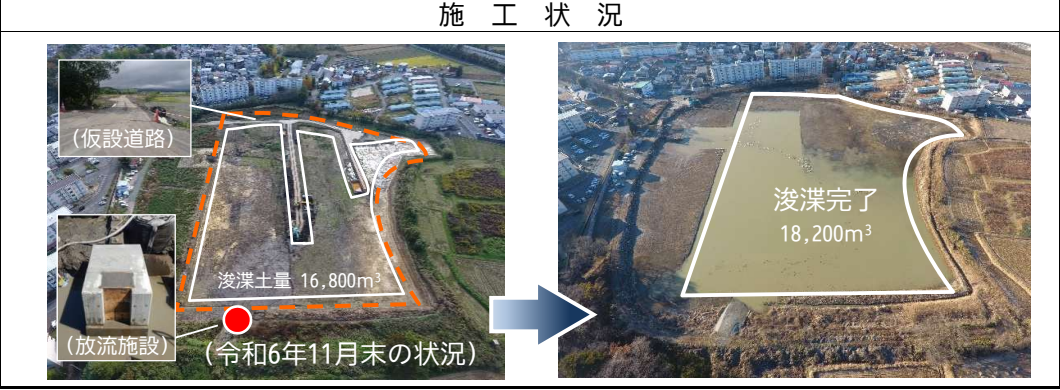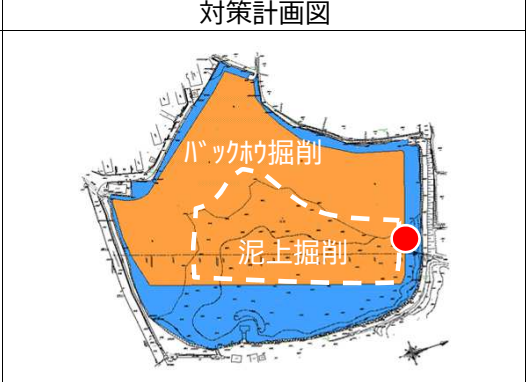

凡 例 浚渫箇所 対策不要 放流施設 計画 実施済 実施予定

③ため池防災・減災事業(宝沢沼)対策工事




契約番号	第 2023002589号	工程表	R 5 年度						R 6 年度											
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
施工箇所	富久山町福原	準備工																		
工 期	R5.10.10～R7.3.17	仮設工																		
契約金額(変更)	¥748,678,700(757,271,900)	浚渫工																		
受注者	壁巣・森尾興発 特定建設工事共同企業体	放流 施設工																		
工事概要	施工面積 A=43,740㎡ 浚渫工 V=16,000㎡ 放流施設工N=1基	跡片付																		
進捗状況	95% (R7年2月末)																			

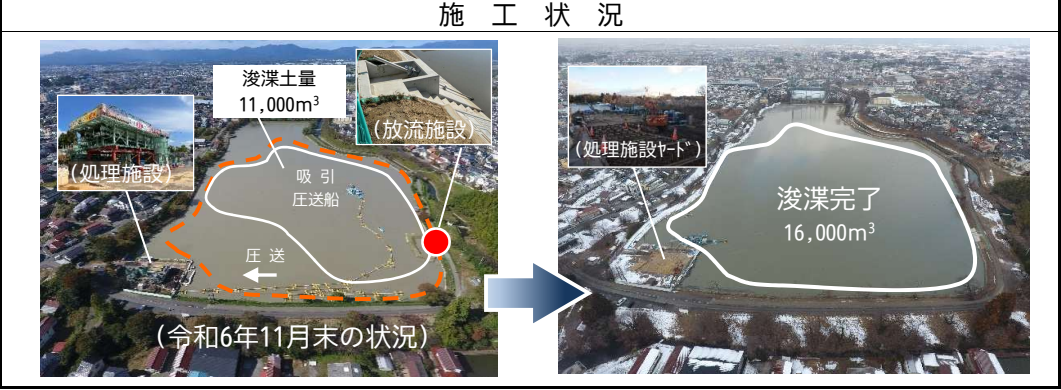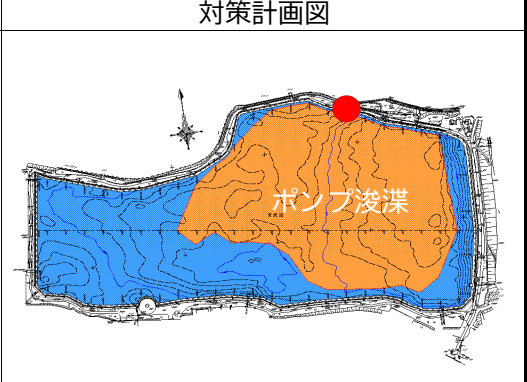

ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

令和6(2024)年度の事業

①ため池防災・減災事業（釜帰池）対策工事																				
契約番号	第 2024003199号	工程表	R 6 年度						R 7 年度											
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
施工箇所	逢瀬町多田野	準備工																		
工 期	R 6.9.24～R 7.5.30	仮設工																		
契約金額	¥42,929,700																			
受注者	壁巢建設株式会社	浚渫工																		
工事概要	施工面積 A=3,100㎡	放流																		
	浚渫工 V=1,550㎡	施設工																		
	放流施設工N=1基	跡片付																		
進捗状況	65%（R 7 年 2 月末）																			

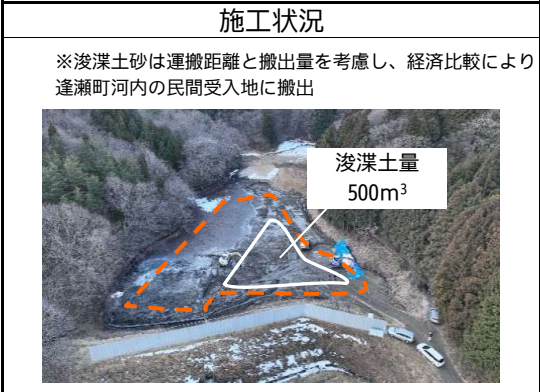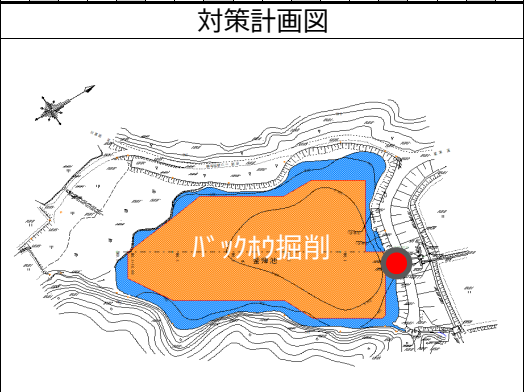
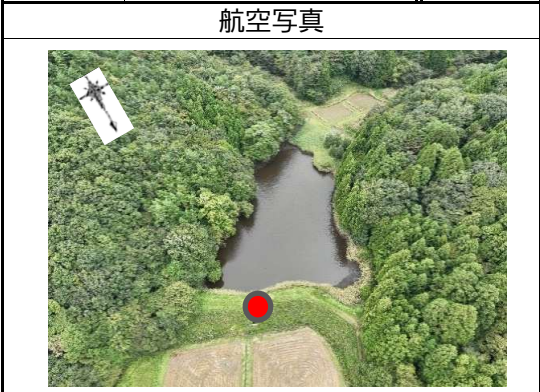


凡 例

浚渫箇所 対策不要 放流施設

計画 実施済 実施予定

②ため池防災・減災事業（下北沢池）対策工事																				
契約番号	第 2024003164号	工程表	R 6 年度						R 7 年度											
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
施工箇所	逢瀬町多田野	準備工																		
工 期	R6.9.24～R7.3.14	仮設工																		
契約金額	¥11,334,400																			
受注者	株式会社小川重工業	放流施設工																		
工事概要	放流施設工N=1基	跡片付																		
進捗状況	90%（R7年2月末）																			

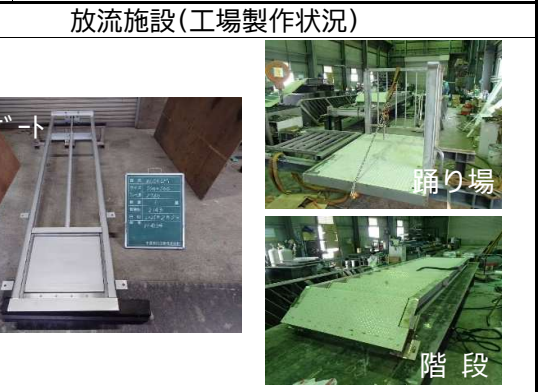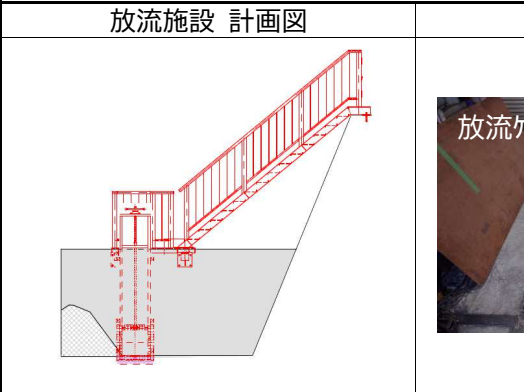

ため池防災・減災事業(P D C A進捗状況報告)

令和6(2024)年度の事業


③ため池防災・減災事業(長岫池)対策工事

契約番号	第 2024002871号	工程表	R 6 年度												R 7 年度											
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
施工箇所	三穂田町野田	準備工																								
工期(変更)	R6.9.6~R7.3.14(3.24)	仮設工																								
契約金額(変更)	¥121,238,700(126,911,400)	浚渫工																								
受注者	壁巢建設株式会社	跡片付																								
工事概要	施工面積 A=7,400㎡																									
	浚渫工 V=3,810㎡																									
進捗状況	80% (R7年2月末)																									


航空写真



対策計画図

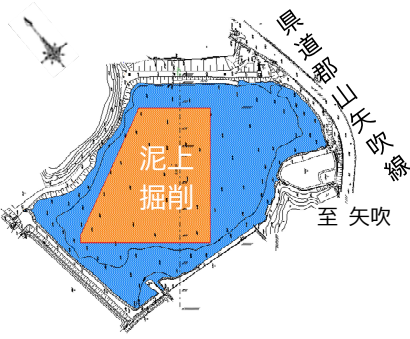

施工状況

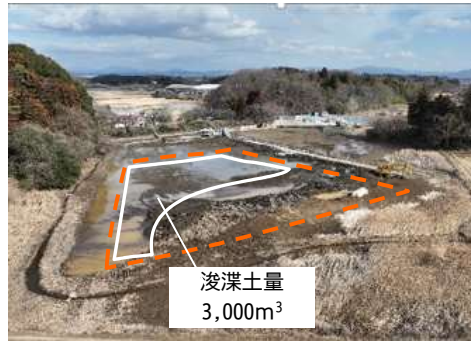

施工状況



凡 例	浚渫箇所	対策不要	放流施設	計画	実施済	実施予定
-----	------	------	------	----	-----	------


④ため池防災・減災事業(原池)対策工事

契約番号	第 2024002380号	工程表	R 6 年度												R 7 年度											
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
施工箇所	田村町御代田	準備工																								
工期(変更)	R6.8.23~R7.3.14(4.11)	仮設工																								
契約金額(変更)	¥31,259,800(33,750,200)	放流施設工																								
受注者	みほと建設株式会社	跡片付																								
工事概要	放流施設工N=1基																									
進捗状況	80% (R7年2月末)																									


航空写真



対策計画図

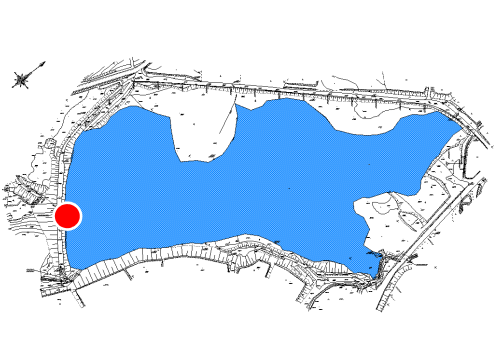

放流施設 計画図

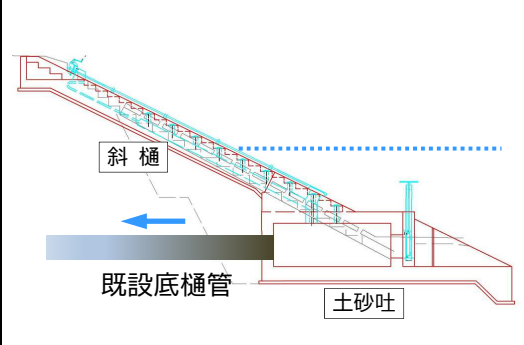

施工状況




令和6(2024)年度の事業

凡 例 浚渫箇所 対策不要 放流施設 計画 実施済 実施予定


⑤ため池防災・減災事業（上の池(上)) 対策工事

契約番号	第 2024002349号	工程表	R 6 年度												R 7 年度											
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
施工箇所	富久山町福原	準備工																								
工 期	R 6.9.26～R 8.1.30	仮設工																								
契約金額	¥159,632,000	浚渫工																								
受注者	三栄建設株式会社	放流施設工																								
工事概要	施工面積 A=8,500㎡ 浚渫工 V=4,540㎡ 放流施設工N=1基	跡片付																								
進捗状況	10% (R 7 年 2 月末)																									


航空写真

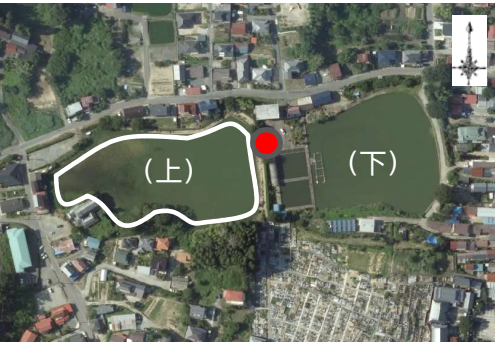

対策計画図

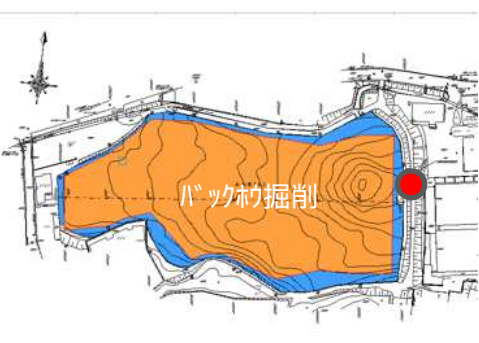

放流施設 計画図

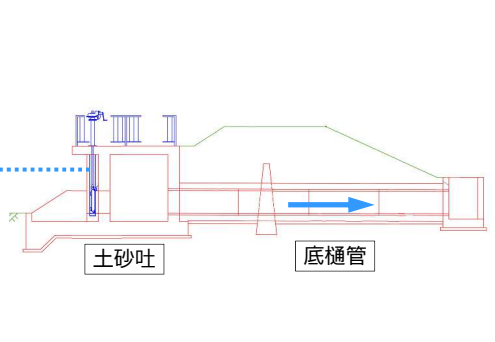


施工状況




⑥ため池防災・減災事業（上の池(下)) 対策工事

契約番号	第 2024003175号	工程表	R 6 年度												R 7 年度											
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
施工箇所	富久山町福原	準備工																								
工 期	R 6.9.24～R 7.5.30	仮設工																								
契約金額	¥29,957,400	放流施設工																								
受注者	合資会社共立社	跡片付																								
工事概要	放流施設工N=1基																									
進捗状況	70% (R 7 年 2 月末)																									


航空写真

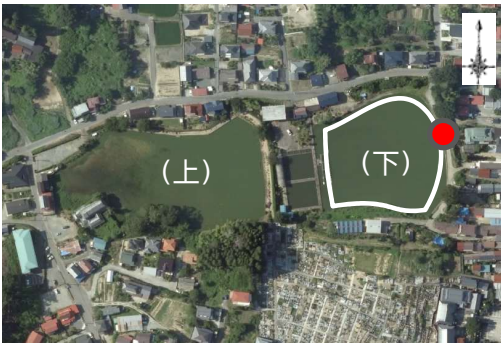

対策計画図

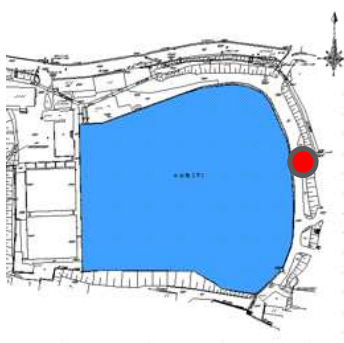

放流施設 計画図

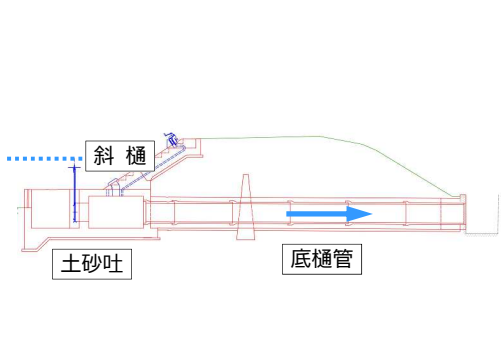

施工状況



浚渫土砂置場（富久山町福原地内・市有地）置場容量 約8万m³



浚渫土砂(令和7年2月末)搬出実績			「単位: m ³ 」
施工年度	対策ため池	土砂置場	民間受入地
R4→5	酒蓋池	16,030	
	五百淵	6,530	
	大久保池	9,290	
計	31,850	31,850	
R5→6	鎌倉池	7,047	
	新 池	18,200	
	宝沢沼	16,000	
計	41,247	41,247	
R6	長岫池	3,000	
	釜帰池		500
計	3,500	3,000	500
合 計	76,597	76,097	500
