

郡山西部第一工業団地（第2期工区）造成工事の完了時期について


令和6年9月造成工事完了を予定していた郡山西部第一工業団地（第2期工区）造成工事について、想定外の岩盤が出土したため、工程に課題が生じ、**令和7年10月造成完了**となる見込みです。

○岩盤出土による影響

- ・岩盤掘削等にかかる費用として、継続費の増額（25億8958万9千円）補正
- ・造成工事の期間を13ヶ月延長（当初 令和6年9月まで → 変更 令和7年10月まで）

岩盤の出土状況

【岩盤の出土分布】

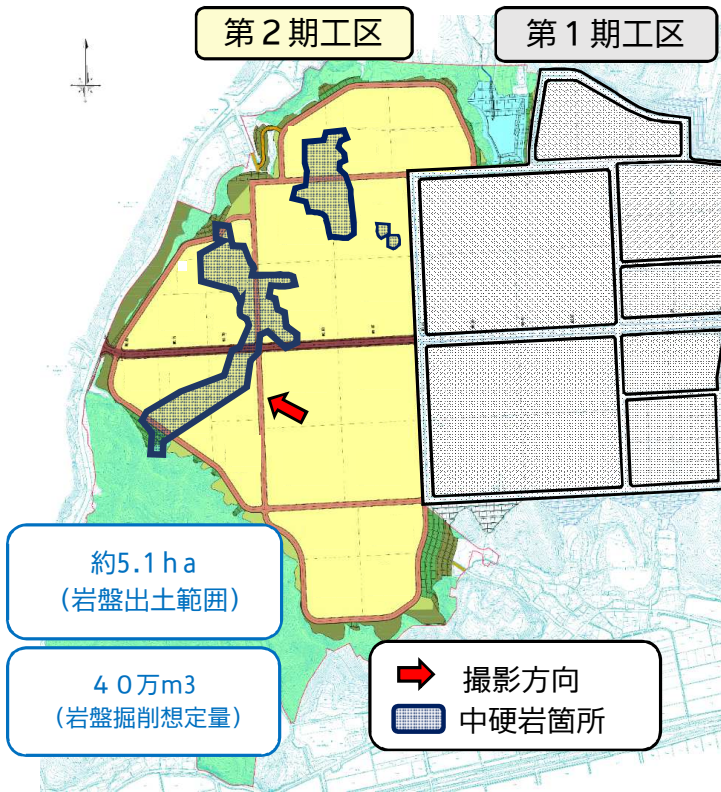

現地写真 (R5.12 時点)



岩盤掘削状況写真

発破後の掘削作業



発破前の削孔作業

工程について

【当初工程と変更工程】

工程	令和4（2022）年度				令和5（2023）年度				令和6（2024）年度				令和7（2025）年度					
	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3		
造成工事			当初工程								変更工程							
土工（切土・盛土） （岩盤掘削）																		
函渠工 （ボックスカルバート）																		
雨水排水工 （道路側溝）																		
道路工 （路盤）																		
その他工事 （水道・ガス）																		
