


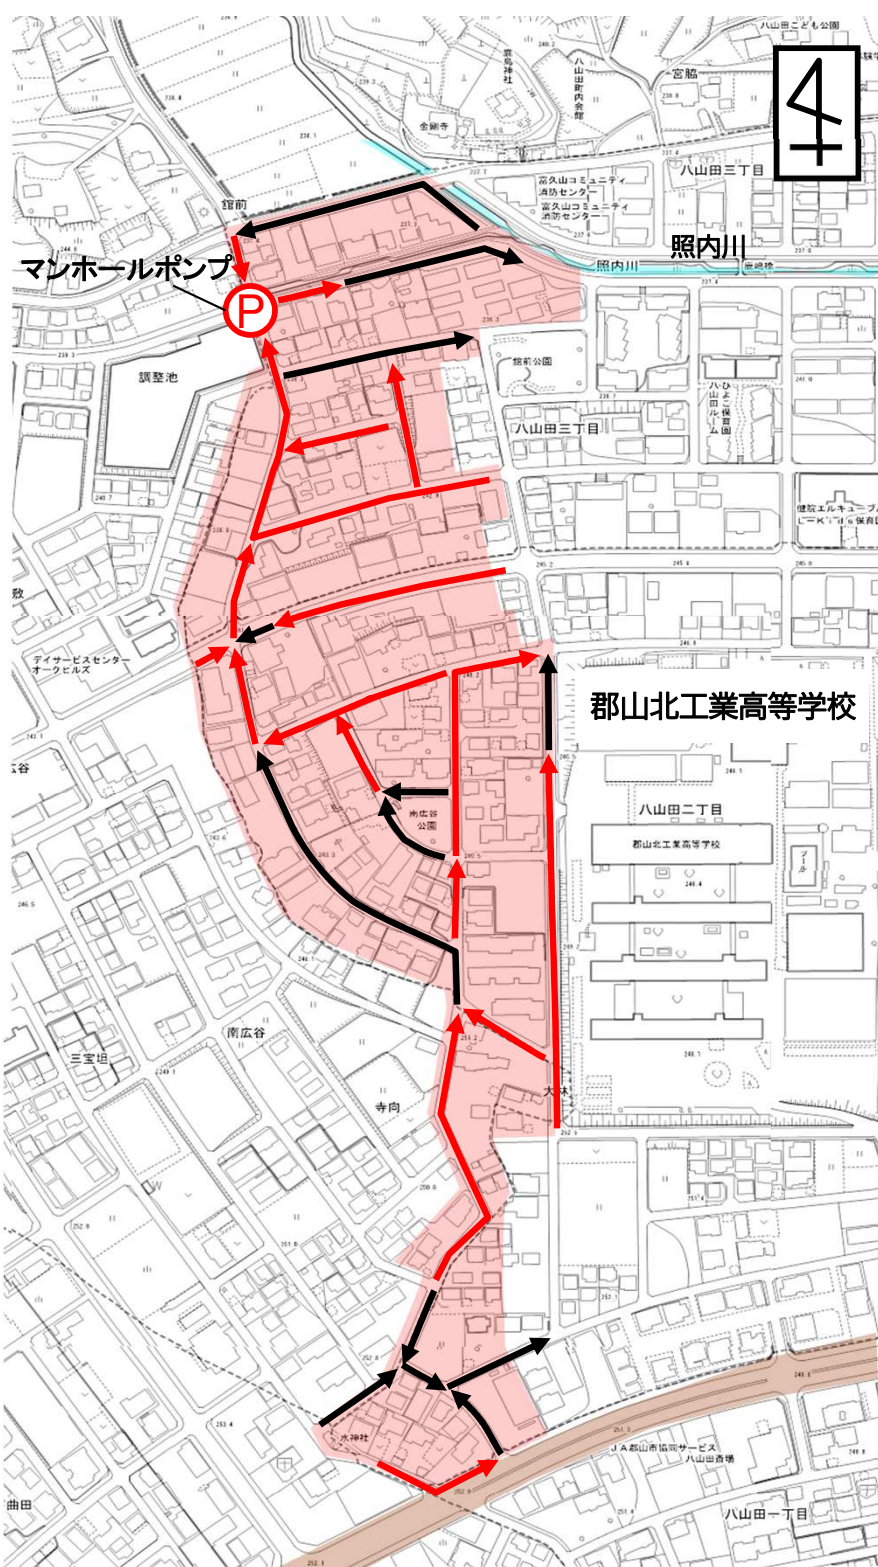

進捗（9月末現在）

→ 下水道管

施工済み →

管路布設状況

990m / 2,890m(1~8工区合算延長)

マンホール設置状況

31箇所 / 89箇所(1~8工区合算箇所)

掘削状況



管路布設状況



現在、下水管の布設工事が本格的に始まり、「道路の掘削」「下水道管の布設」「埋戻し」「舗装の仮復旧」の流れで施工しております。工事中は車の出入り等、皆様にご不便をおかけしますが、安全第一で進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
