


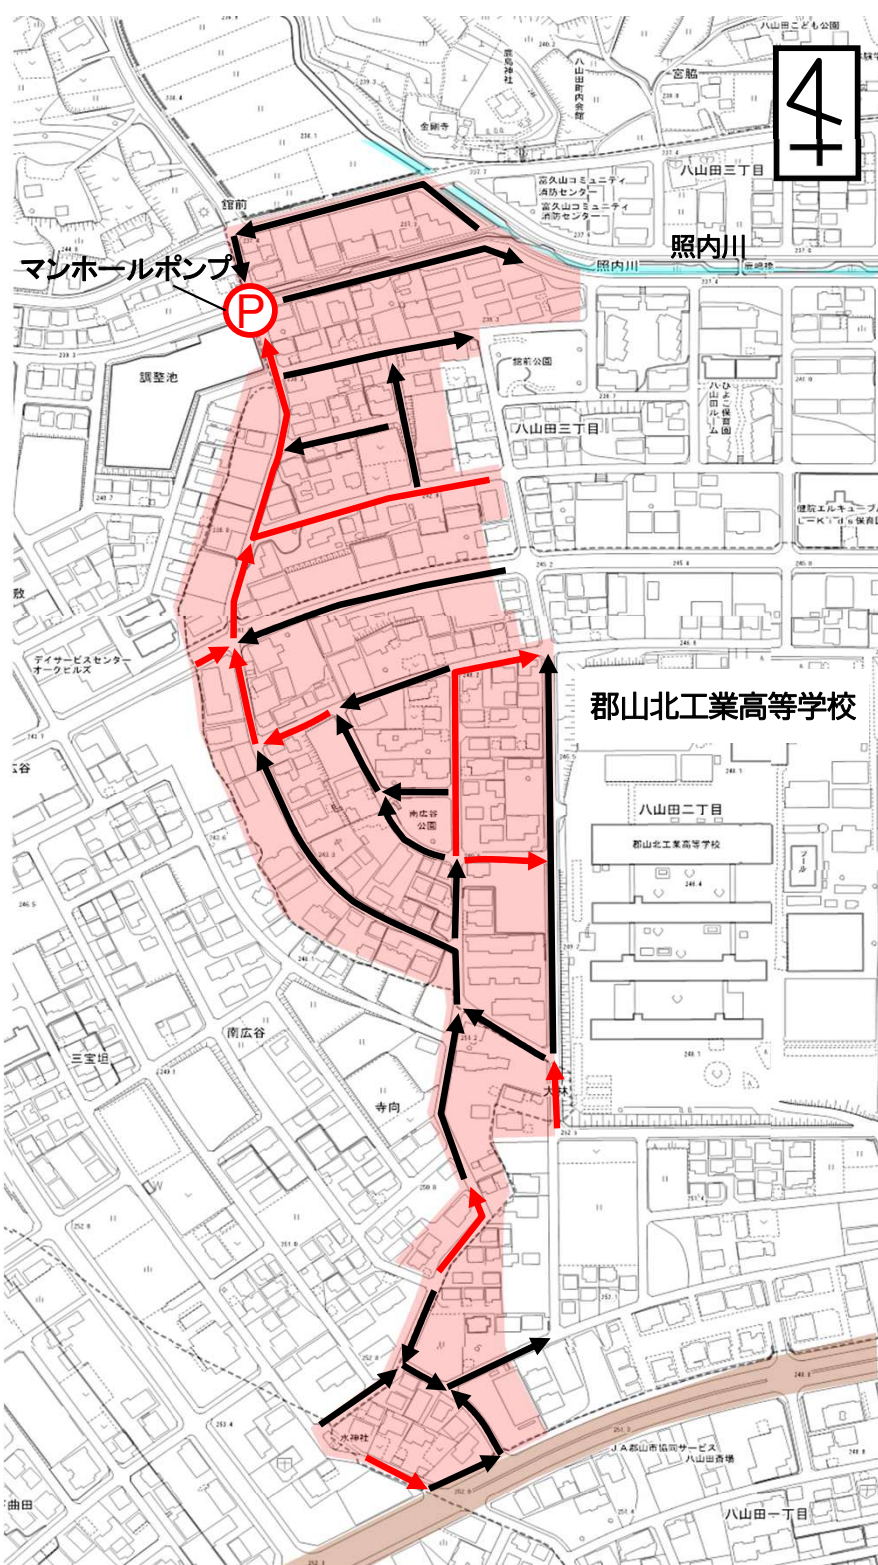

進捗（10月末現在）

→ 下水道管

施工済み →

管路布設状況

1,815m / 2,890m(1~8工区合算延長)

マンホール設置状況

54箇所 / 89箇所(1~8工区合算箇所)

マンホール据付状況



マンホール設置状況



着手から3ヶ月が過ぎ、皆様のご協力もいただき、工事は順調に進んでおります。現在の工事全体の進捗も50%を越えました。

日没の時間も早まってきましたので、事故等がないようにさらに安全対策に留意してまいります。
