

進捗（11月末現在）

→ 下水道管

約81%（2,340m / 2,890m）

施工済み →

管路布設状況

2,340m / 2,890m(1～8工区合算延長)


マンホール設置状況

71箇所 / 89箇所(1～8工区合算箇所)

掘削状況



汚水管設置状況

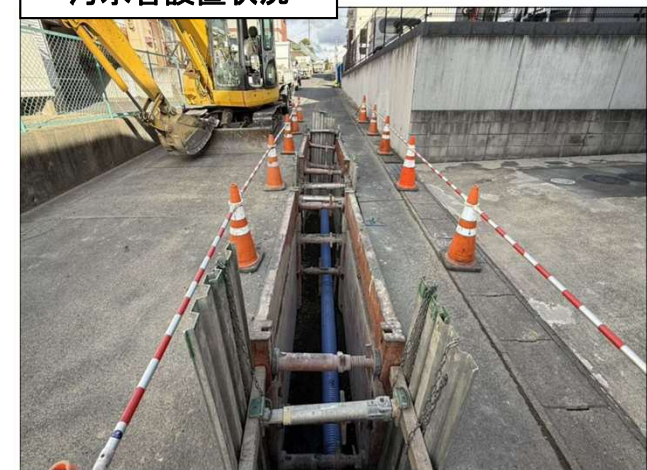

着手から約4ヶ月が過ぎ、皆様のご協力もいただき、工事は順調に進んでおります。工事全体の進捗は80%を越え、工事完了の現場も出てきました。

これから師走に入り、さらに忙しくなる時期となりますが、事故等がないようにさらに安全対策に留意してまいります。
