


149号雨水幹線公共下水道築造工事 第3工区 工事状況

令和8年6月末 進捗率 約80%

6月は、ボックスカルバート布設などを行いました。
7月は、覆工板撤去及び鋼矢板引抜きなどを行います。

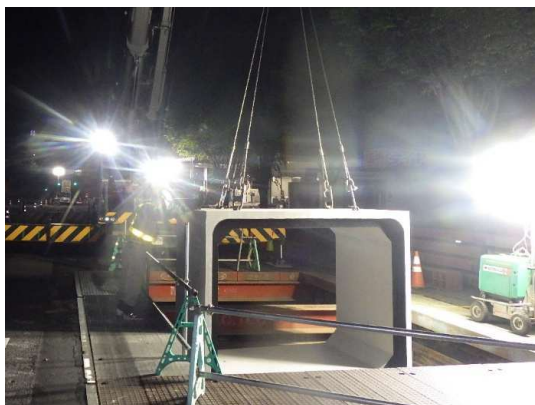


ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了



埋戻し転圧状況

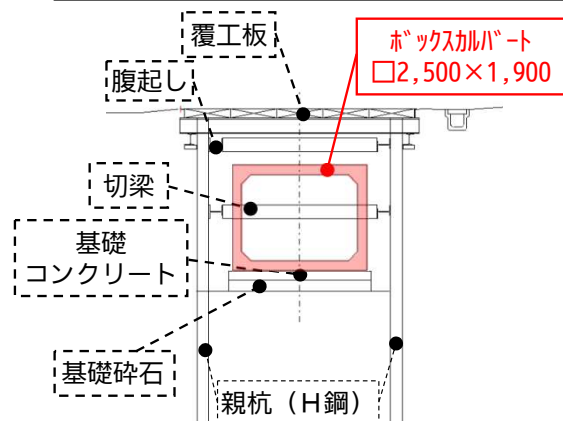

断面図

位置図

