

公共下水道整備事業 富田東地区

4

進捗(9月末現在)

約65%(4590m / 7070m)

測量設計期間

1工区：R7.2月～R7.6月

2工区：R7.3月～R8.5月

3工区：R7.5月～R8.8月

富田東
小学校

富田
中学校

2工区


1工区

3工区

郡山インター線

5-1号污水幹線

凡 例	
整備済	
富田東地区 施工済	
施工予定	
事業計画区域	

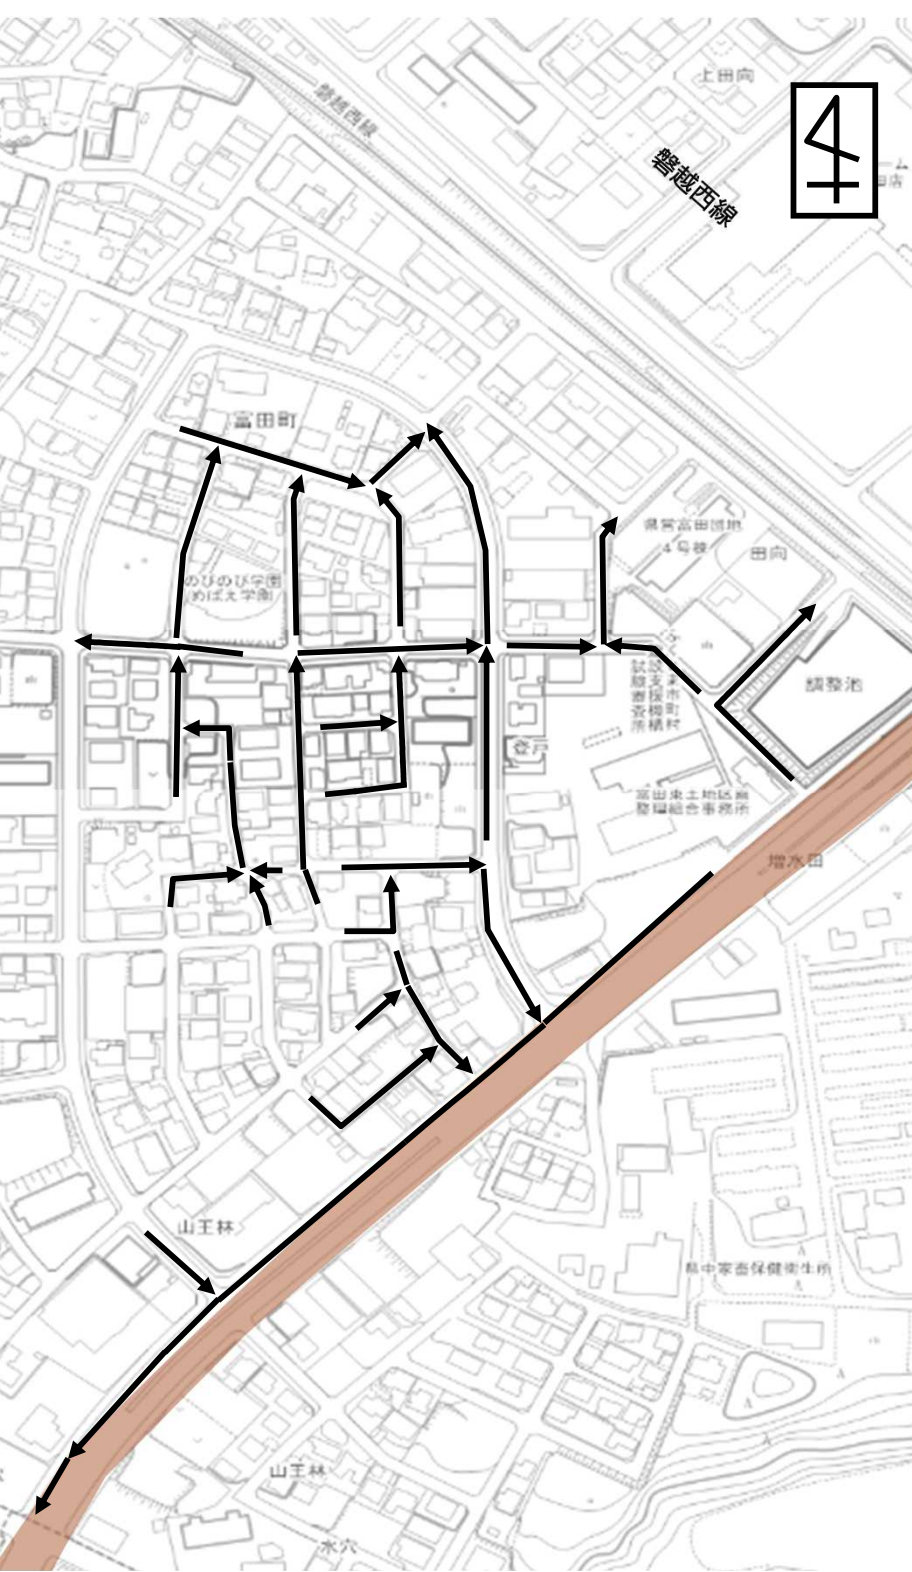

1 工区進捗 (工事完了)

施工済み下水道本管 →

管路布設状況

2372m / 2372m

マンホール設置状況

80箇所 / 80箇所

舗装完了状況



舗装完了状況



着手から約11ヶ月が過ぎ、皆様のご協力をいただき、工事は順調に進み、下水道本管の施工を終え、区画線工事を含め舗装工事も完了しました。

引き続き2工区での施工を行っておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

4

2工区進捗（9月末現在）



下水道本管

施工済み



管路布設状況

2218m / 2521m

マンホール設置状況

75箇所 / 82箇所

管布設状況



管布設状況



現在、2工区にて下水道管の布設工事が本格的に始まり、「既設舗装の撤去」→「道路の掘削」→「下水道管の布設」→「埋戻し」→「舗装の仮復旧」の流れで施工しております。工事中は車の出入り等、皆様にご不便おかけしますが、安全第一で進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
