

133号雨水幹線公共下水道築造工事第8工区 工事状況

令和3年9月末 進捗率 約13%

9月は、ボックスカバーの布設に支障となる道路付属物及び植栽の撤去を行い、仮設土留(H鋼杭打込)及び覆工板設置に着手しました。


10月は、引き続き、覆工板設置を行い、ボックスカバーの布設に係る掘削・支保工、基礎工等に着手します。




道路植栽伐採・撤去状況



仮設土留に係る掘削状況

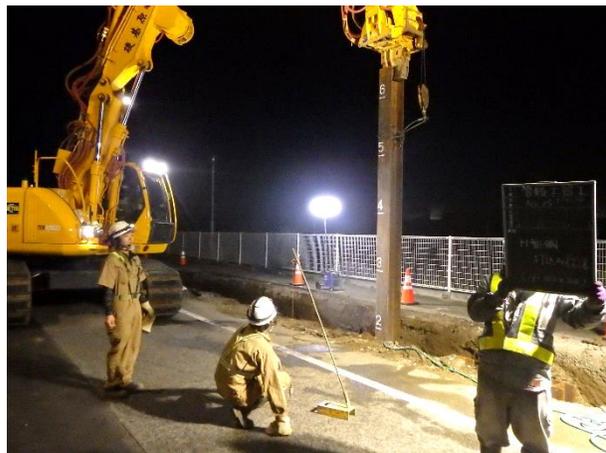

仮設土留(H鋼杭打込)状況

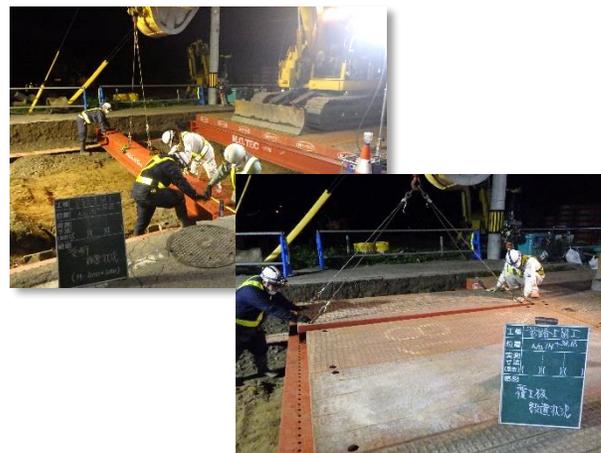

覆工板設置状況

