

麓山導水管築造工事第3工区 工事状況

令和3年9月末 進捗率 約62%


9月は、舗装取壊し、建込簡易土留を行いながら掘削、導水管に支障となる既設埋設管の撤去、導水管本体(ヒューム管)設置(施工延長約102m完了)を行いました。また、No.3特殊人孔付近の地盤改良を行いました。10月は、引き続き、導水管本体(ヒューム管)設置等を行います。




舗装取壊し、掘削・土留設置状況



導水管(統合管)設置状況

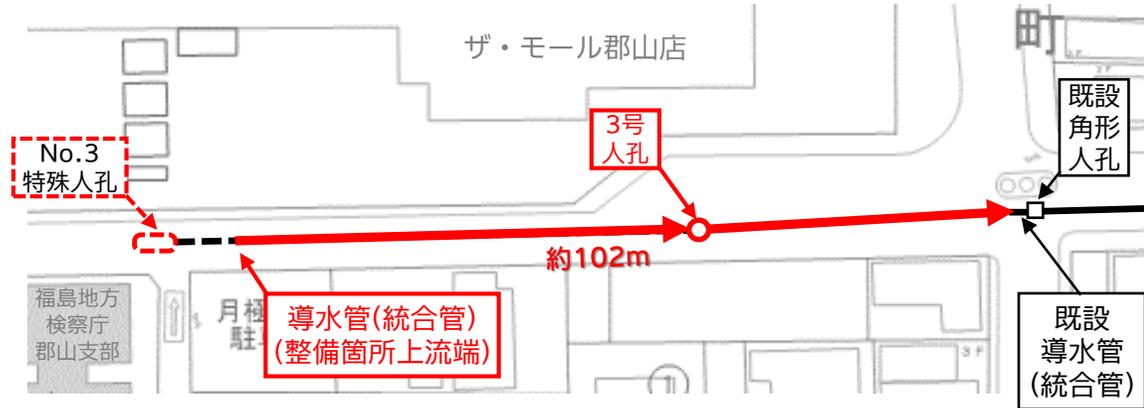


計画平面図(21世紀記念公園北西側)

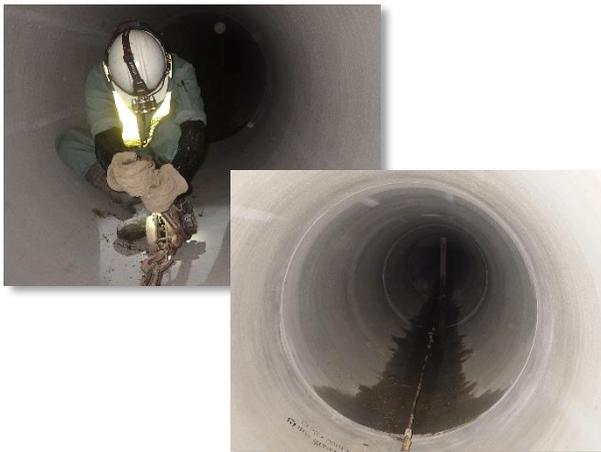

導水管(統合管)設置状況



地盤改良(薬液注入)状況

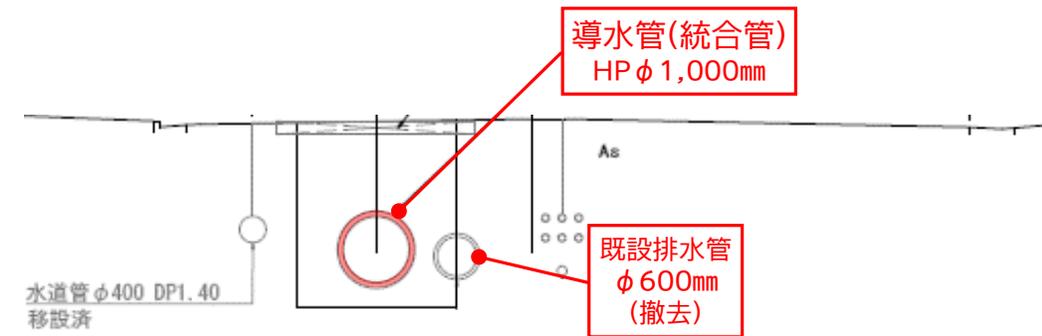

計画断面図
