

# 麓山導水管築造工事第3工区 工事状況

令和3年8月末 進捗率 約45%


8月は、建込簡易土留を行いながら掘削、仮排水管設置及び導水管本体設置に支障となる既設排水管の撤去、導水管本体(ヒューム管)及び人孔設置を行い、施工延長約46mが完了しました。  
9月は、引き続き、導水管本体(ヒューム管)設置等を行います。



掘削・土留及び仮排水管設置状況



既設排水管(HP管)撤去状況

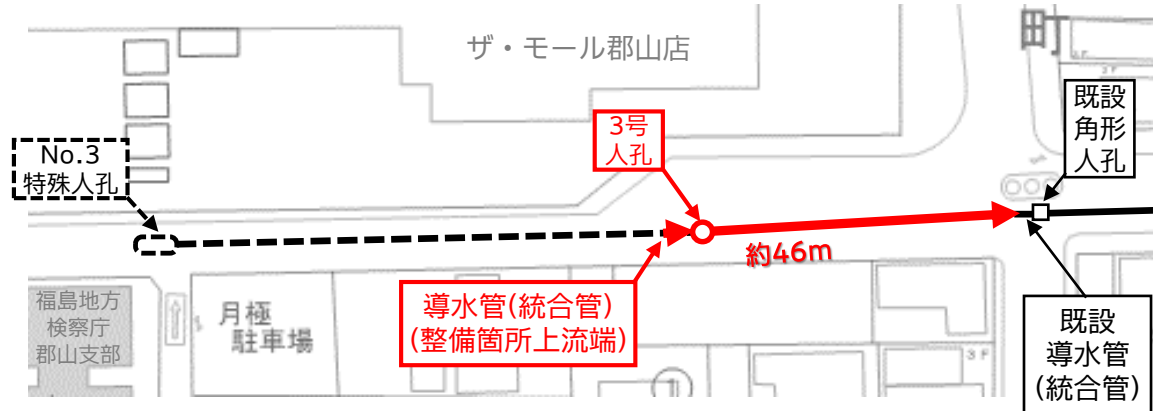


計画平面図(21世紀記念公園北西側)



導水管(統合管)及び人孔設置状況



埋戻し・転圧及び舗装回復旧状況

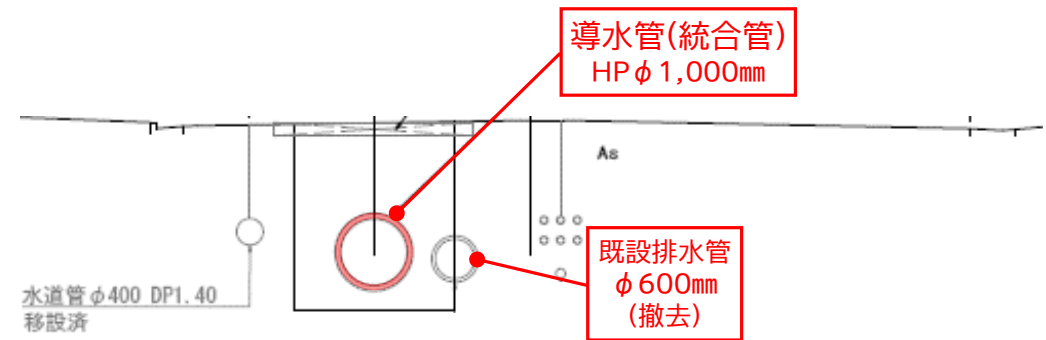

計画断面図
