

麓山導水管築造工事第3工区 工事状況

令和3年7月末 進捗率 約36%

7月は、建込簡易土留を行いながら掘削、仮排水管設置及び導水管本体設置に支障となる既設排水管等の撤去を行い、導水管本体(ヒューム管)設置に着手し、施工延長約29m完了しました。
8月は、引き続き、導水管本体(ヒューム管)設置等を行います。




掘削・土留及び仮排水管設置状況

既設排水管(HP管)撤去状況




導水管(統合管)設置状況

埋戻し・転圧及び舗装仮復旧状況

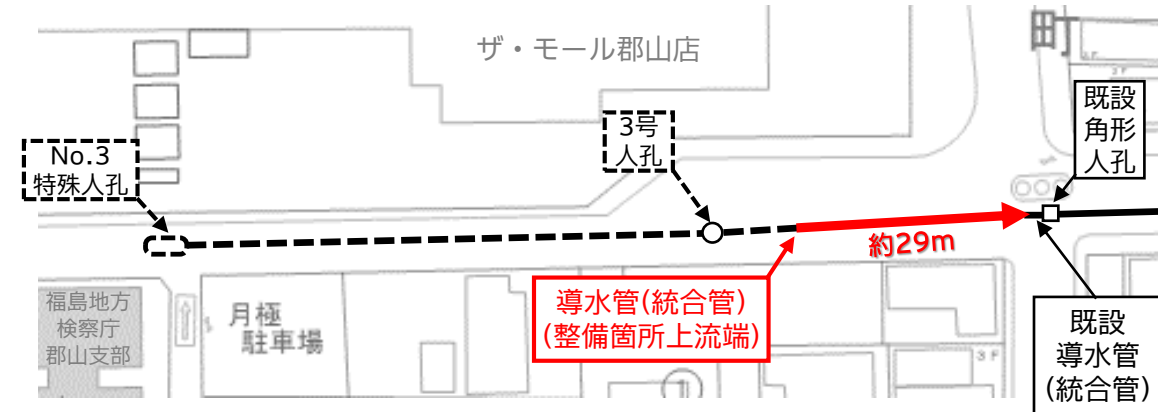

計画平面図(21世紀記念公園北西側)

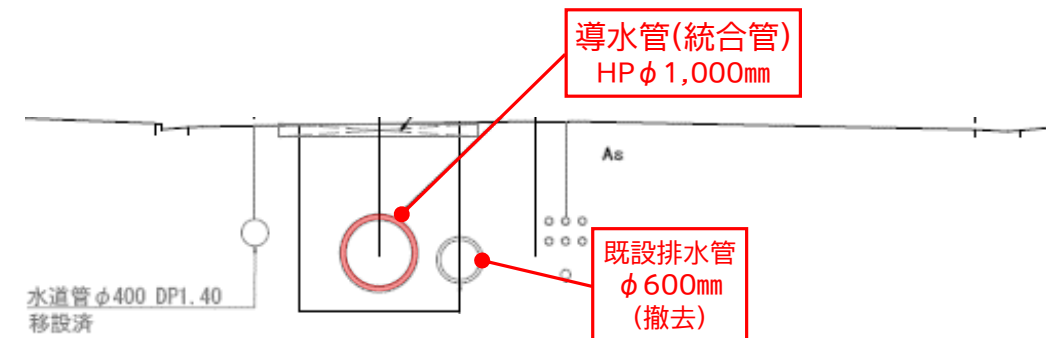

計画断面図
