

麓山導水管築造工事第3工区 工事状況

令和3年6月末 進捗率 約19%


6月は、建込簡易土留を行いながら、導水管本体設置に支障となる埋設管等の撤去及び仮排水管設置を行いました。
7月は、引き続き、仮排水管の設置を行い、導水管本体(ヒューム管)設置に着手します。



既設埋設管(陶管)撤去状況



既設埋設管(ダクタイル鋳鉄管)撤去状況

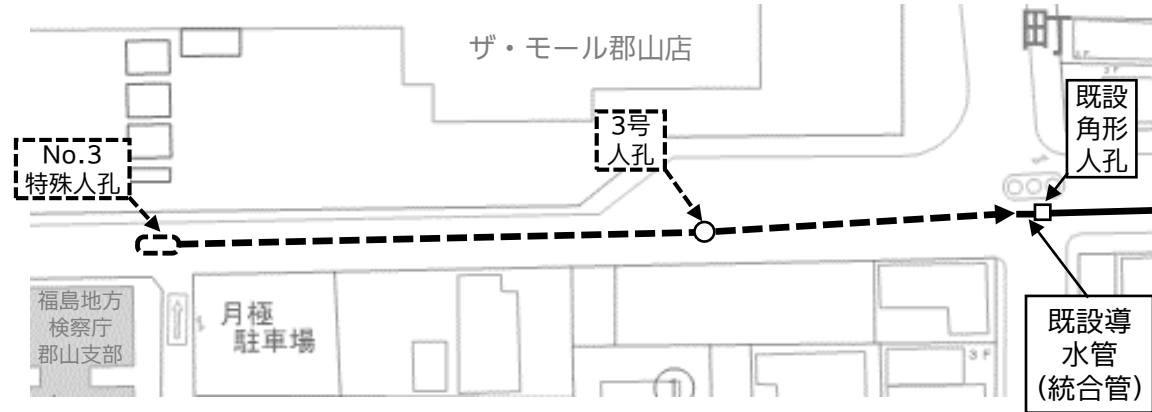


計画平面図(21世紀記念公園北西側)



交通規制状況



仮排水管(合流管)設置状況

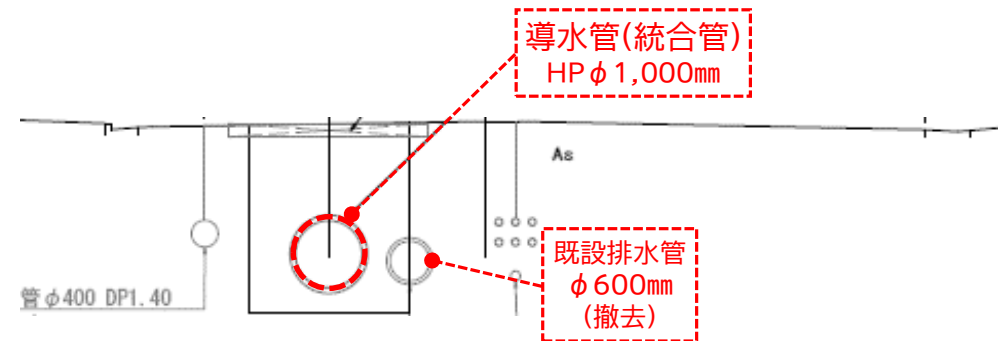

計画断面図
