

# 麓山導水管築造工事第2工区 工事状況

令和3年1月末 進捗率 約90%

1月は、ボックスカルバート及びヒューム管布設、角形マンホール設置(施工延長約128m完了)等を行いました。2月は、仮設土留及び覆工板の撤去、舗装仮復旧等を行い、2工区の工事が完了する見込みです。



ボックスカルバート布設状況




ボックスカルバート布設(完了)状況




角形マンホール基礎工(7°レキャストコンクリート板設置)状況



角形マンホール設置状況

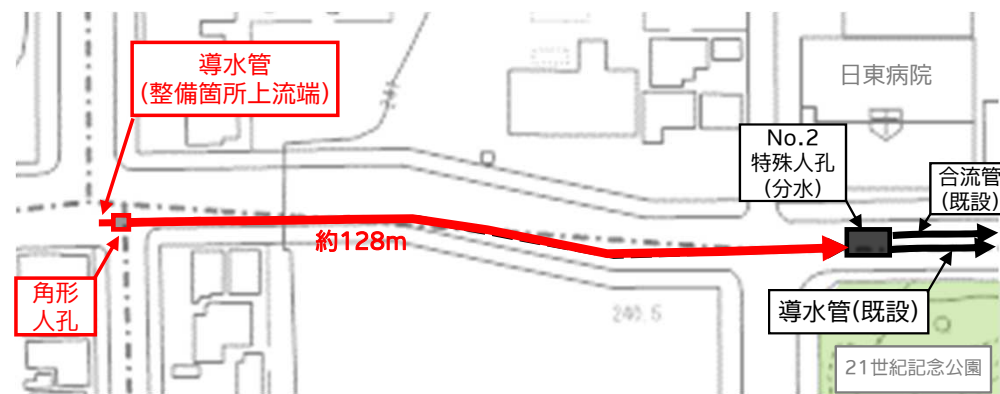

計画平面図(21世紀記念公園北西側)

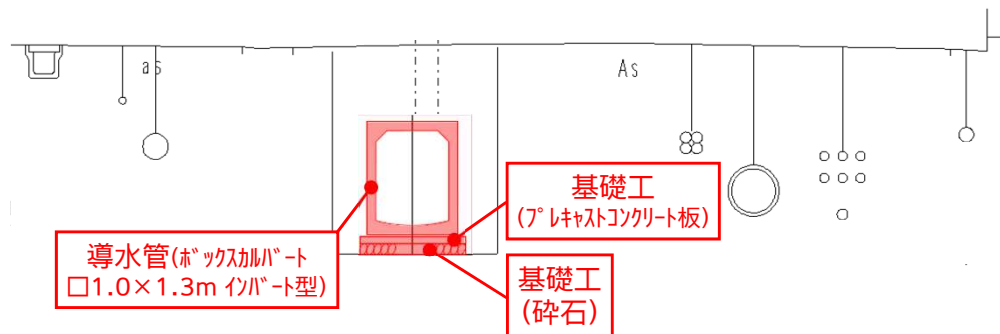

計画断面図
