

# 麓山導水管築造工事第2工区 工事状況

令和2年11月末 進捗率 約60%

11月は、ボックスカルバート布設(約100m完了)を行い、角形人孔設置に係る覆工板設置等を行いました。  
12月は、引き続き、ボックスカルバート布設等を行います。



基礎工(7°レキャストコンクリート板設置完了)状況



ボックスカルバート布設状況




計画平面図(21世紀記念公園北西側)



覆工板設置状況



地盤改良(薬液注入)状況

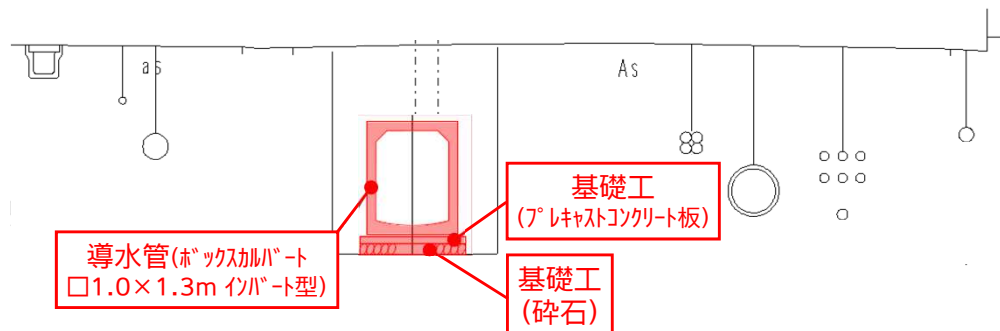

計画断面図
