

麓山導水管築造工事第2工区 工事状況

令和2年8月末 進捗率 約35%

8月は、建込簡易土留を行いながら、掘削、ボックスカルバート布設(約28m完了)、埋戻し、舗装仮復旧等を行いました。
9月は、引き続き、ボックスカルバート布設等を行います。




掘削状況




ボックスカルバート布設状況



計画平面図(21世紀記念公園北西側)

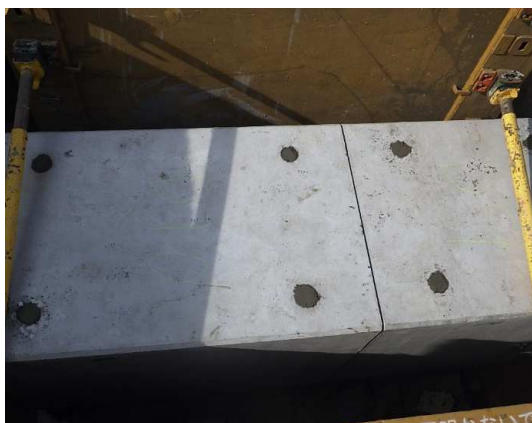

ボックスカルバート布設完了状況

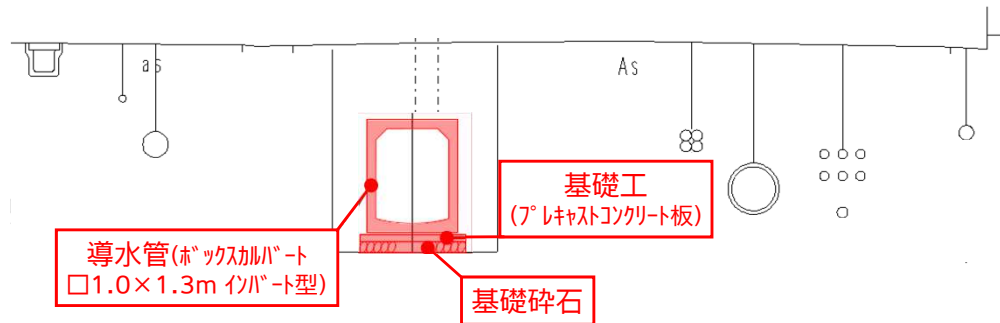

計画断面図
