


# 麓山導水管築造工事第1工区 工事状況

令和元年5月末 進捗率 約92%


5月は、既設排水(下水道)管の一部取壊しを行い、No.1及びNo.2特殊人孔のコンクリート打設を行いました。  
6月は、No.2特殊人孔(分水人孔)の埋戻し及び仮設土留撤去、舗装仮復旧を行い、工事を完了する見込みです。



コンクリート打設(配筋)状況(No.2特殊人孔)

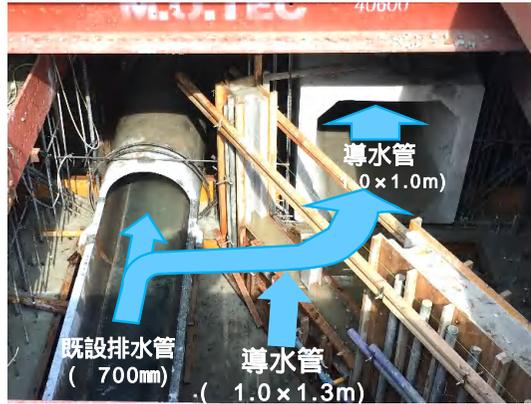

既設排水管一部取壊し完了状況(No.2特殊人孔)

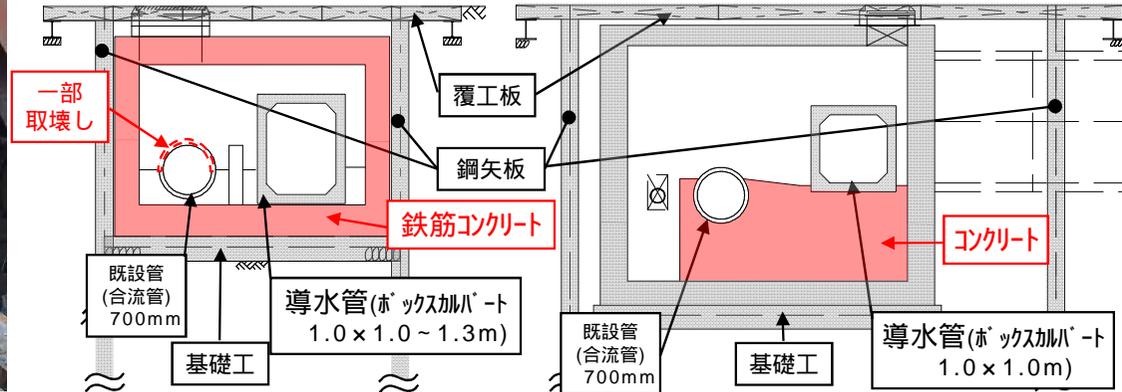

(No.2特殊人孔)計画断面図


(No.1特殊人孔)計画断面図



コンクリート打設(配筋完了)状況(No.2特殊人孔)



コンクリート打設完了状況(No.2特殊人孔)

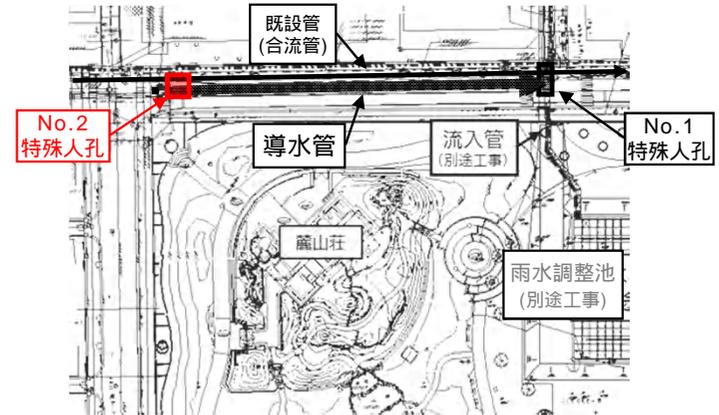

計画平面図(21世紀記念公園北側)
