

麓山導水管築造工事第1工区 工事状況

12月末 進捗率 約13%


12月は、No.2特殊人孔の鋼矢板設置及び地盤改良を行い、No.1特殊人孔の鋼矢板設置に着手しました。
1月は、引き続き、No.1特殊人孔の鋼矢板設置を行い、地盤改良に着手します。



鋼矢板設置状況(No.2特殊人孔)



鋼矢板設置状況(No.1特殊人孔)

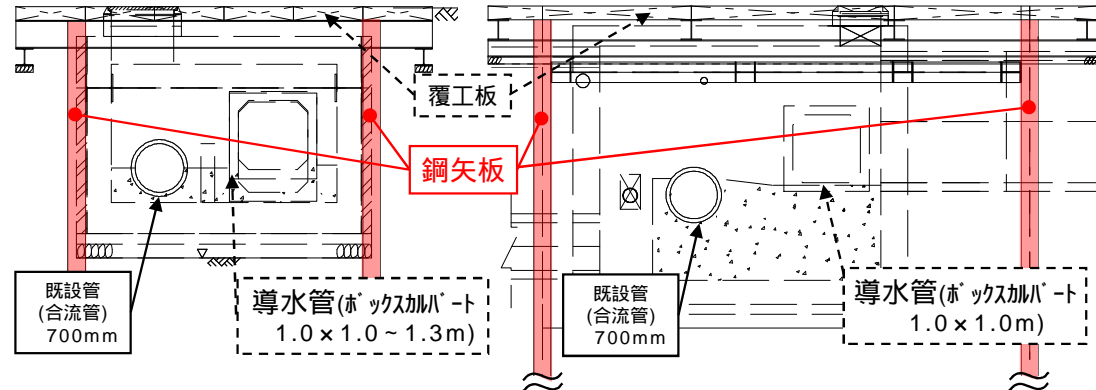

(No.2特殊人孔)計画断面図


(No.1特殊人孔)計画断面図



地盤改良状況(No.2特殊人孔)



地盤改良状況(No.2特殊人孔)

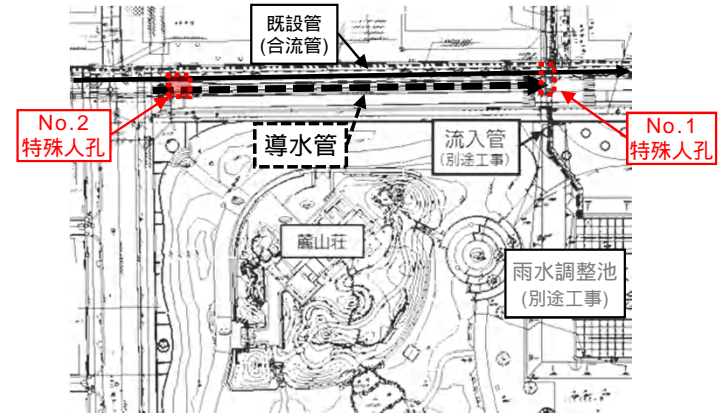

計画平面図(21世紀記念公園北側)
