

麓山調整池築造工事 工事状況

5月末 進捗率 約28%

5月は、調整池本体の基礎工(基礎砕石、均しコンクリート、基礎コンクリート(配筋・打設))に着手しました。
6月は、基礎コンクリートの養生後に調整池本体となる貯留ブロックの設置に着手します。




基礎砕石敷均し状況



均しコンクリート打設状況




基礎コンクリート配筋状況

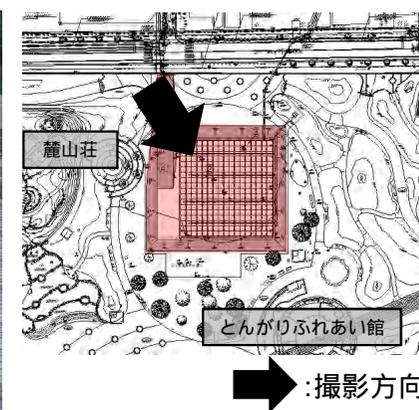

計画平面図(21世紀記念公園内)



基礎コンクリート打設完了状況

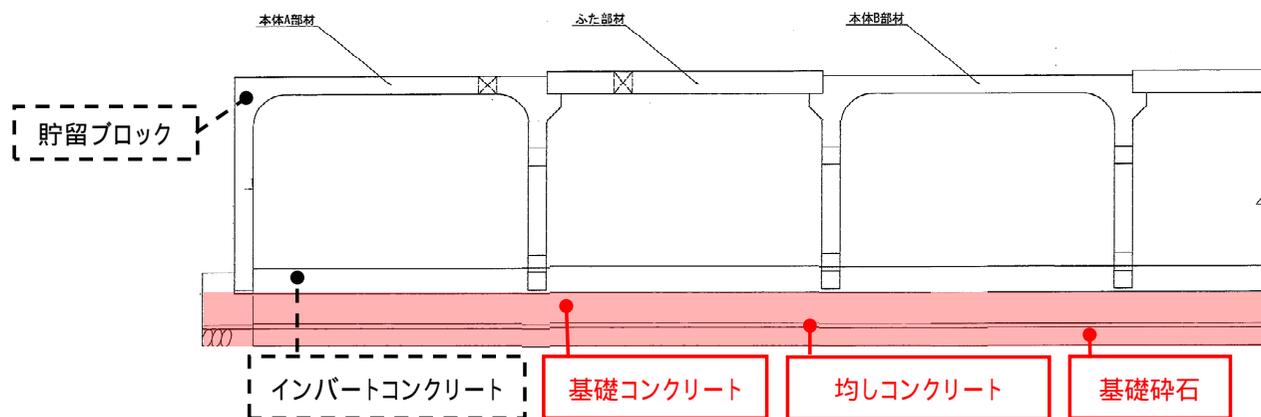

断面図(21世紀記念公園内)
