

## 3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

令和元年12月末 進捗率 約97%

12月は、立坑No.2の仮設土留撤去、No.2及びNo.3の特殊人孔築造(ｲﾝﾊﾞｰﾄ工)を行い、No.4の特殊人孔築造が完了しました。

1月は、立坑No.2及びNo.3の特殊人孔築造を完了させ、立坑No.4の埋戻し及び仮設土留撤去等を行います。

立坑No.2




仮設土留撤去状況

立坑No.2




特殊人孔築造(ｲﾝﾊﾞｰﾄ)状況(上流側を望む)

立坑No.3

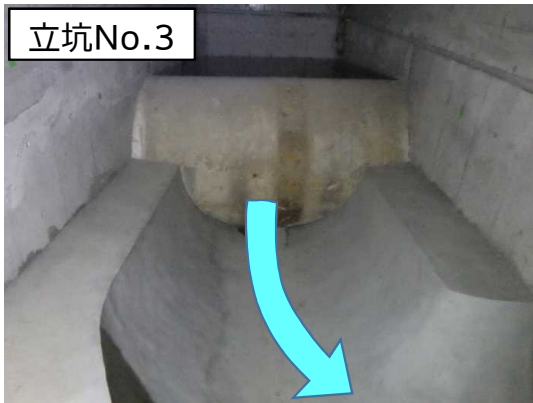


特殊人孔築造(ｲﾝﾊﾞｰﾄ)状況(上流側を望む)

立坑No.4

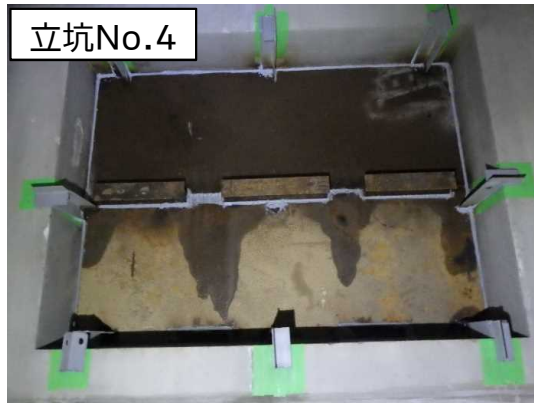

特殊人孔築造完了(上流側閉塞)状況

位置図

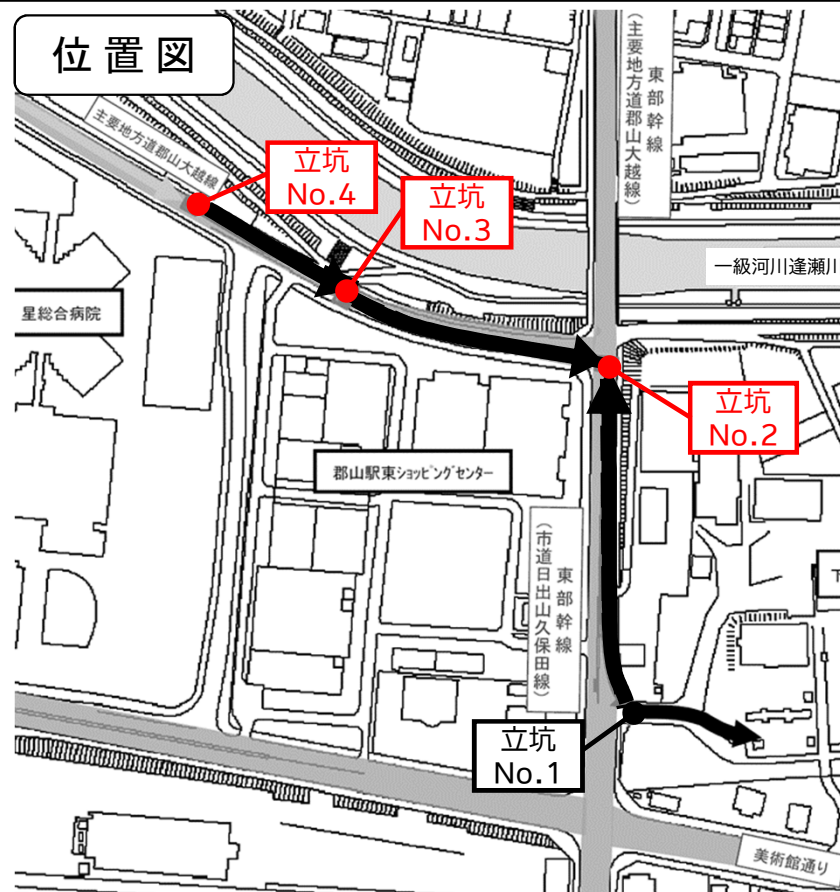

掘進機※ …地中を掘り進むための機械。(撤去済)
