

3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

令和元年10月末 進捗率 約93%

10月は、立坑No.2の特殊人孔築造が完了し、埋戻し及び立坑No.3の特殊人孔築造に着手しました。
11月は、引き続き、立坑No.2の埋戻し及び立坑No.3の特殊人孔築造を行い、仮設土留等撤去に着手します。

立坑No.2




埋戻し(準備)状況

立坑No.3



特殊人孔築造(底盤コンクリート打設)状況


立坑No.4~3
(内部)

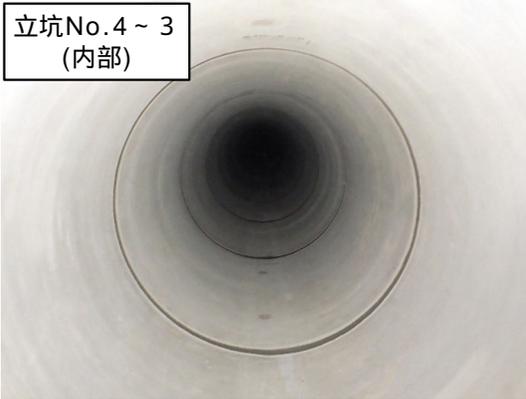

推進工法(ヒューム管目地仕上げ)状況

市民及び関係者の皆様へ
この度、10月に発生した台風19号により、本工事現場及び現場事務所が被災しました。
そのため、工事の進捗が遅れる見込みとなり、11月末の工期までに工事を完了することができなくなりました。
11月現在、応急復旧を行うとともに、今後、工期を延期する予定です。
今後とも本工事へのご理解とご協力をお願いします。

位置図

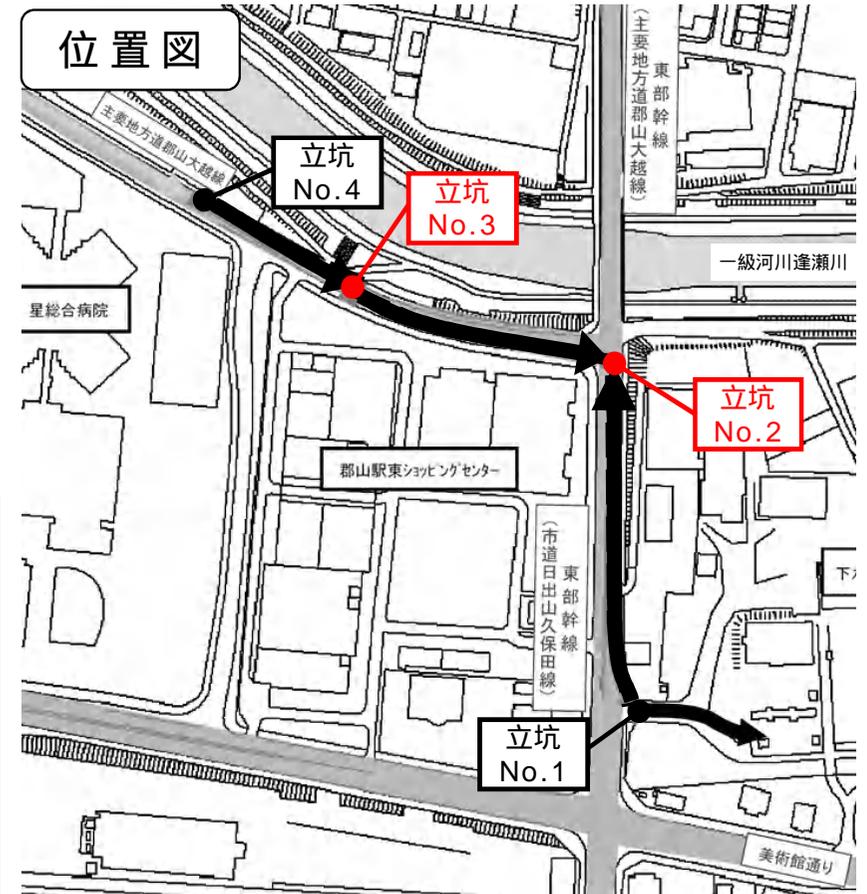

掘進機 ...地中を掘り進むための機械。
