


3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

令和元年9月末 進捗率 約92%


9月は、立坑No.4～3までのヒューム管布設が完了し、立坑No.1及び2の特殊人孔築造を行いました。
10月は、立坑No.2及び3の特殊人孔築造を完了し、仮設土留等撤去及び舗装仮復旧に着手します。

立坑No.4～3
(内部)

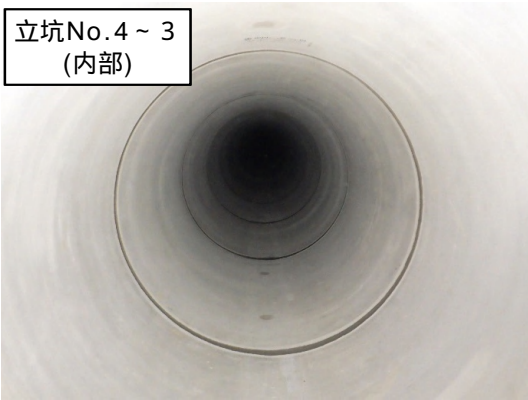


推進工法(ヒューム管布設完了)状況

立坑No.2

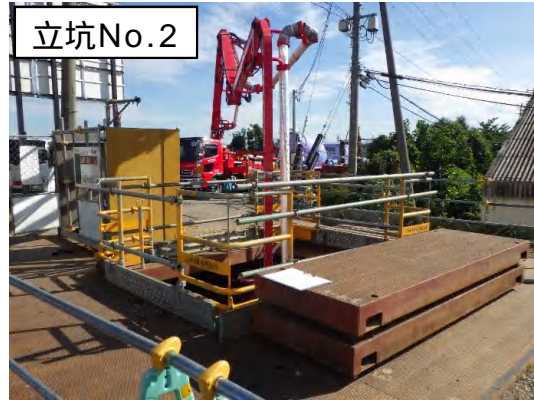


躯体コンクリート打設状況

立坑No.1

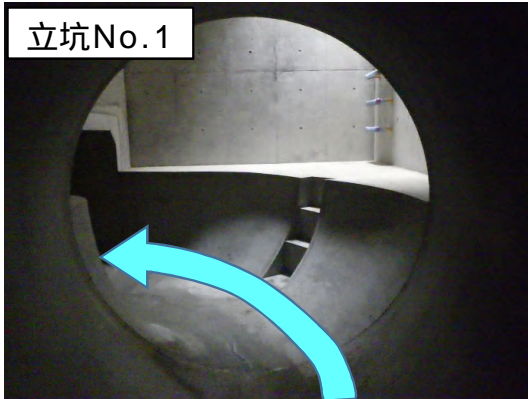


特殊人孔築造(バルト)状況(下流側を望む)

立坑No.1

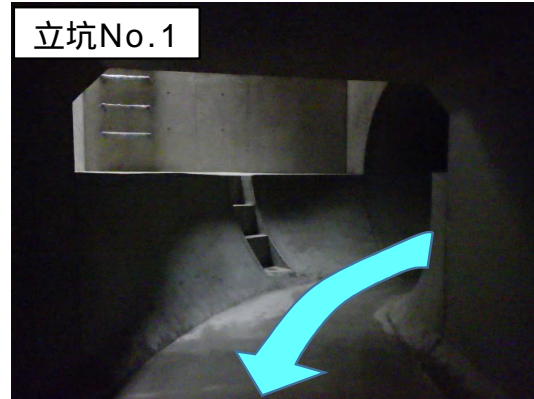

特殊人孔築造(バルト)状況(上流側を望む)

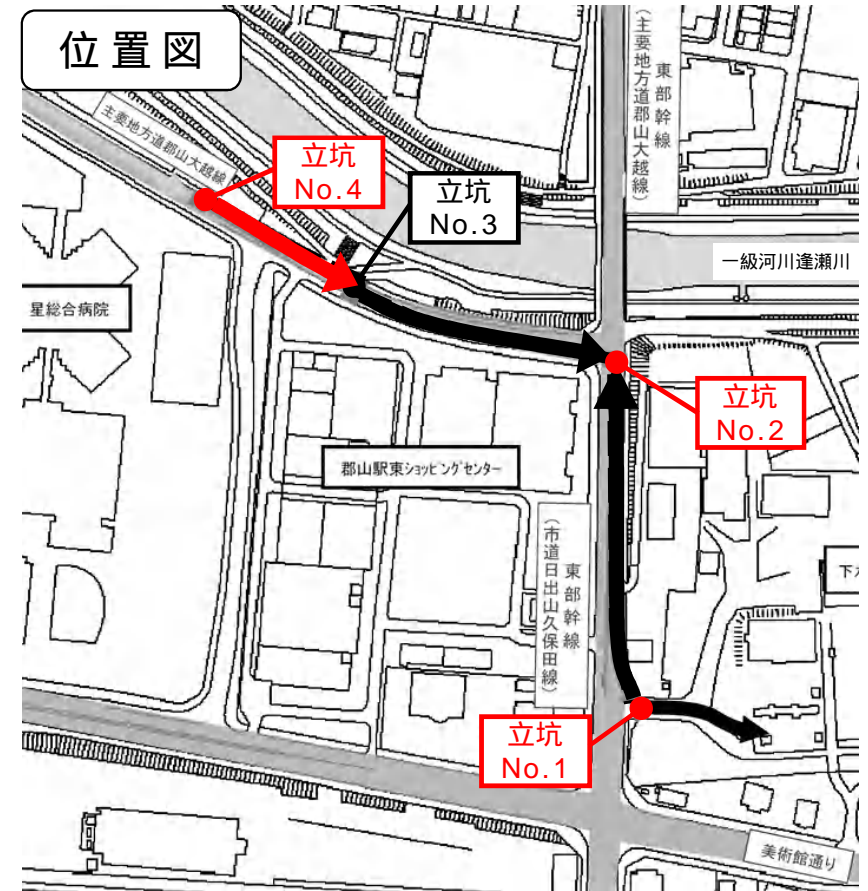

掘進機 ...地中を掘り進むための機械。
