

## 3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

令和元年6月末 進捗率 約80%

6月は、立坑No.3～2までのヒューム管布設が完了し、立坑No.4に基礎コンクリート打設を行いました。  
7月は、立坑No.1の特殊人孔の築造に着手し、立坑No.4に掘進機を搬入・据付を行います。



立坑No.2

推進工法(掘進機到達)状況




立坑No.2

推進工法(掘進機到達)状況



立坑No.4

基礎コンクリート打設状況

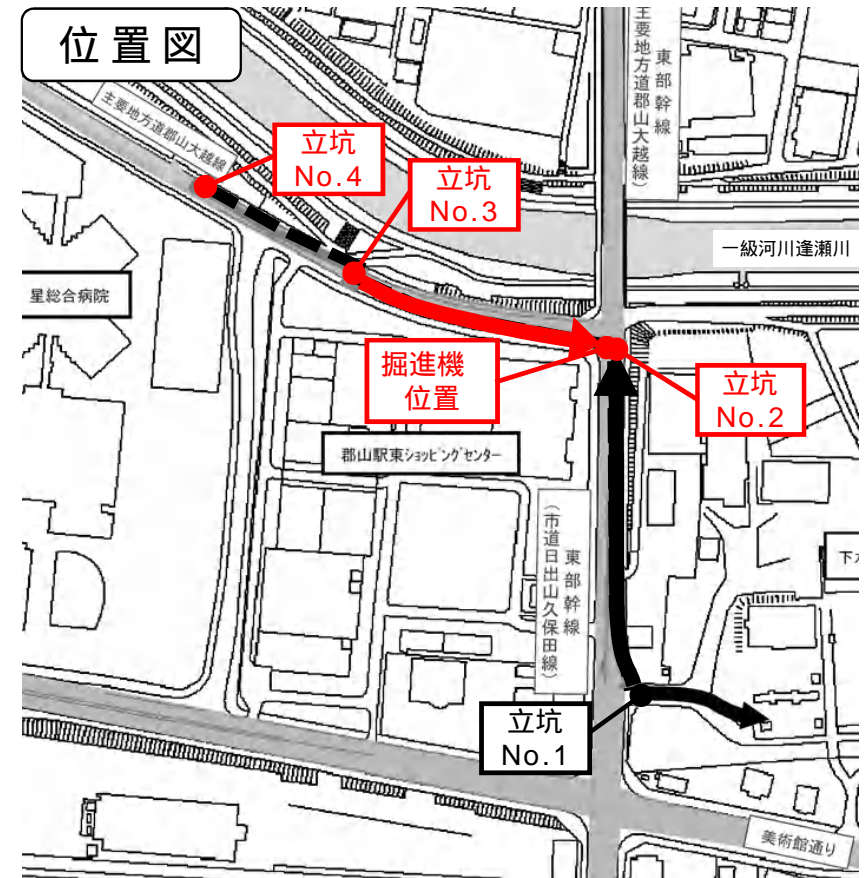

掘進機 ...地中を掘り進むための機械。
