

3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況


平成31年4月末 進捗率 約65%

4月は、立坑No.1～2までのヒューム管布設が完了し、立坑No.3の掘削及び基礎工(コンクリート打設)を行いました。
5月は、立坑No.3に掘進機 の搬入及び据付を行い、立坑No.3～2までのヒューム管布設に着手します。




立坑No.1(発進側)

推進工法(ヒューム管布設完了)状況

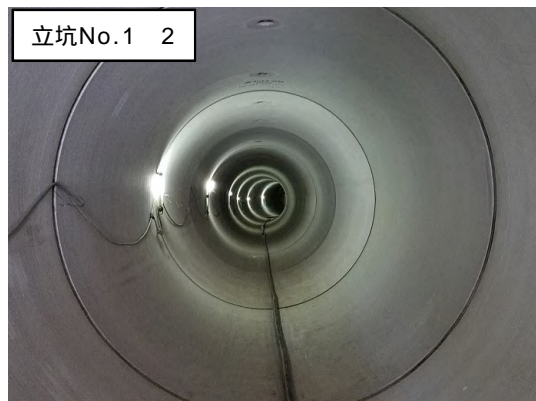

立坑No.1 2

推進工法(ヒューム管布設完了)状況

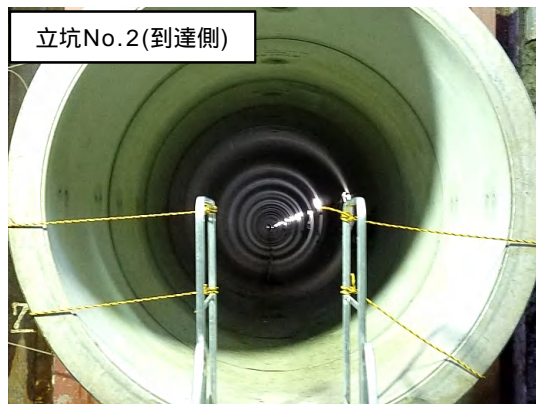


立坑No.2(到達側)

推進工法(ヒューム管布設完了)状況



立坑No.3

基礎工(コンクリートポンプ車打設)状況

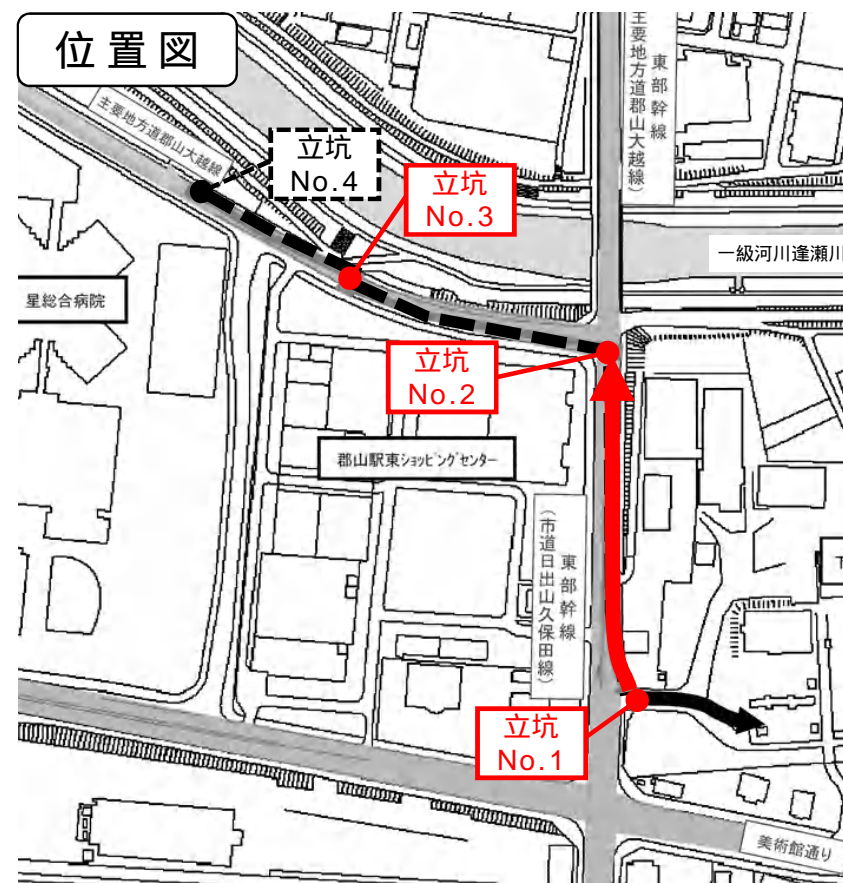

位置図

立坑
No.4

立坑
No.3

立坑
No.2

立坑
No.1

掘進機 ...地中を掘り進むための機械。
