

3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

2月末 進捗率 約47%

2月は、立坑No.3の覆工板設置、No.2の基礎工、No.1～2までの推進工法によるヒューム管布設に着手しました。3月は、引き続き、立坑No.1～2までのヒューム管布設を行い、立坑No.3の掘削(支保工)に着手します。

立坑No.3



覆工板設置完了状況

立坑No.2




特殊人孔の基礎工(コンクリート打設)状況

立坑No.1




推進工法(ヒューム管搬入)状況

立坑No.1

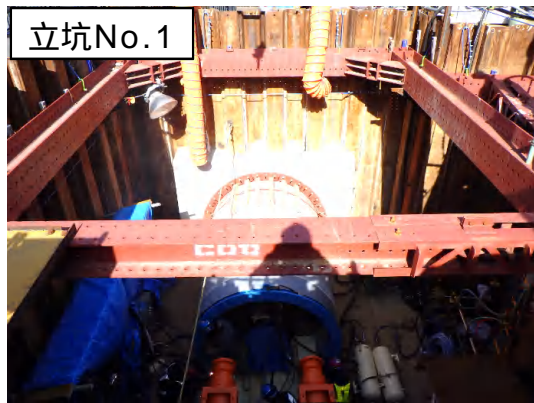

推進工法(ヒューム管布設)状況

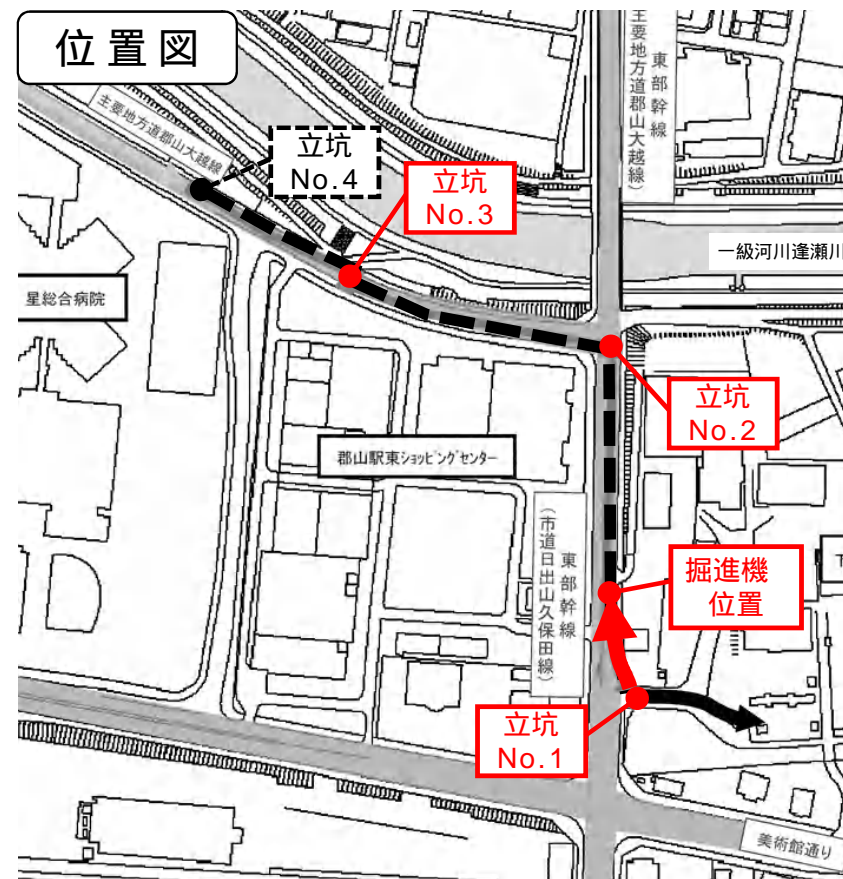

掘進機...地中を掘り進むための機械。
