

112号雨水幹線公共下水道築造工事第3工区 工事状況

令和3年6月末 進捗率 約82%

6月は、到達立坑に隣接する分水人孔(2次施工分)築造(配筋・型枠設置・コンクリート打設)等を行いました。
7月は、分水人孔(2次施工分)築造完了後に埋戻し、仮設土留の撤去等を行います。



分水人孔築造(配筋)状況




分水人孔築造(配筋・型枠設置完了)状況



分水人孔築造(コンクリートポンプ車打設)状況



分水人孔築造(コンクリート打設完了)状況

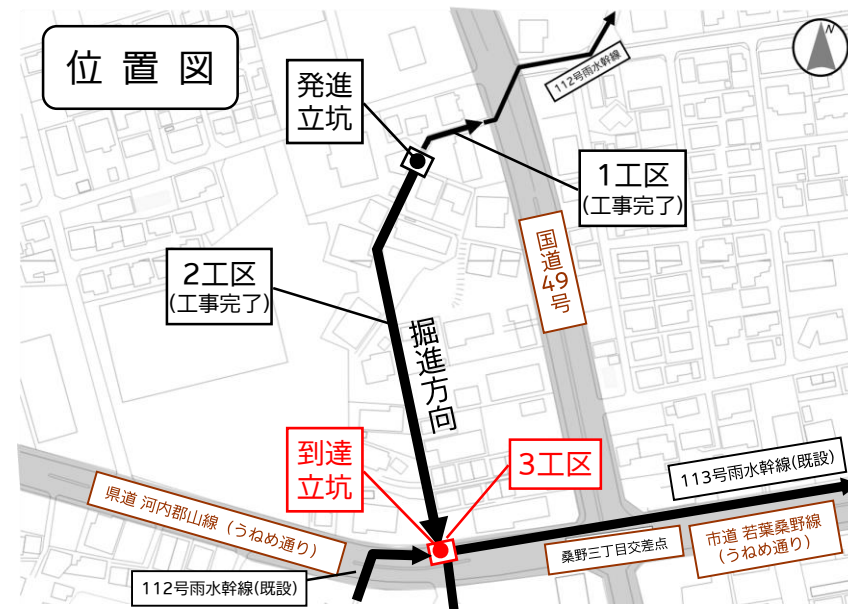

断面図

分水人孔平面図

