

# 112号雨水幹線公共下水道築造工事第2工区 工事状況

令和2年9月末 進捗率 約80%


9月は、オープンシールド機により掘進(土留・掘削)しながら、ボックスカルバート布設及び埋戻しを行いました。  
10月は、2工区上流部にあたる追加工事の発注が遅れているため、一旦、工事を一時中止します。工事の中止に伴い、市民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力くださいますようお願いいたします。



オープンシールド機による掘進(土留・掘削)状況




オープンシールド機(R2.2月工場仮組検査時点)

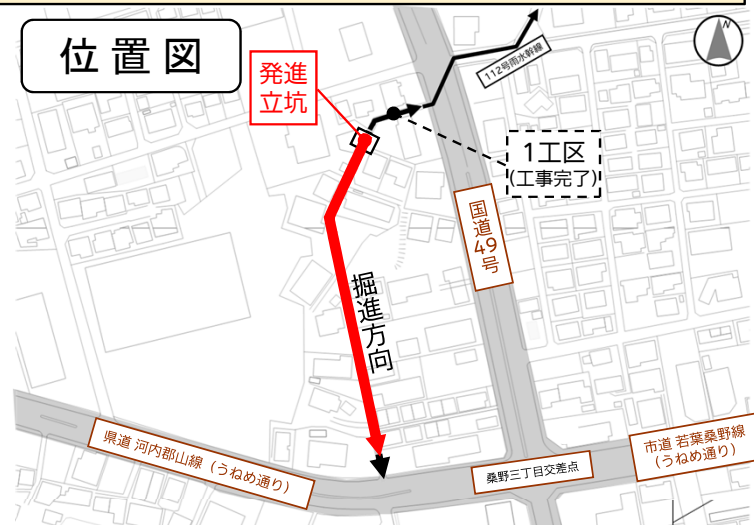


位置図



ボックスカルバート布設状況

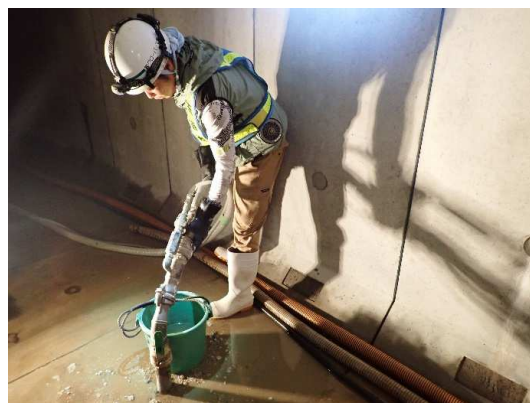

ボックスカルバート布設(裏込め注入)状況

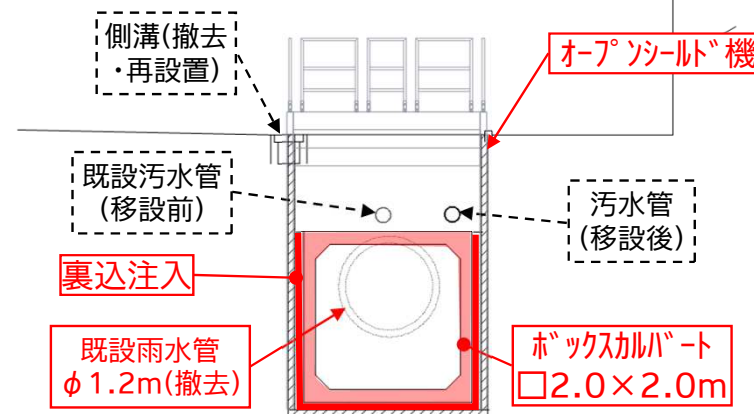

裏込め注入

既設雨水管  
φ1.2m(撤去)

オープンシールド機

汚水管  
(移設後)

ボックスカルバート  
□2.0×2.0m
