

112号雨水幹線公共下水道築造工事第2工区 工事状況

令和2年7月末 進捗率 約62%


7月は、オーブソーラー機により掘進(土留・掘削)しながら、ボックスカバート布設及び埋戻しを行いました。
8月は、引き続き、オーブソーラー機により掘進しながら、ボックスカバート布設等を行います。



オーブソーラー機による掘進(土留・掘削)状況



オーブソーラー機(R2.2月工場仮組検査時点)

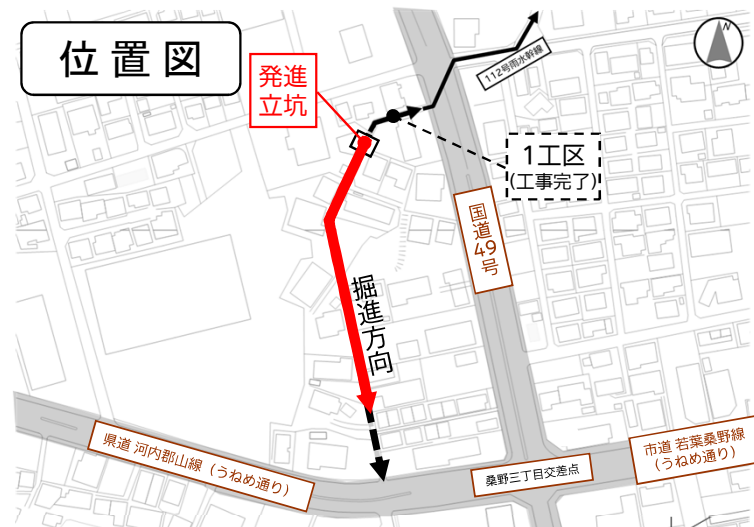

位置図

発進立坑

掘進方向

1工区
(工事完了)

桑野三丁目交差点

県道 河内郡山線 (うねめ通り)


市道 若葉桑野線 (うねめ通り)



ボックスカバート搬入・運搬状況



ボックスカバート布設状況

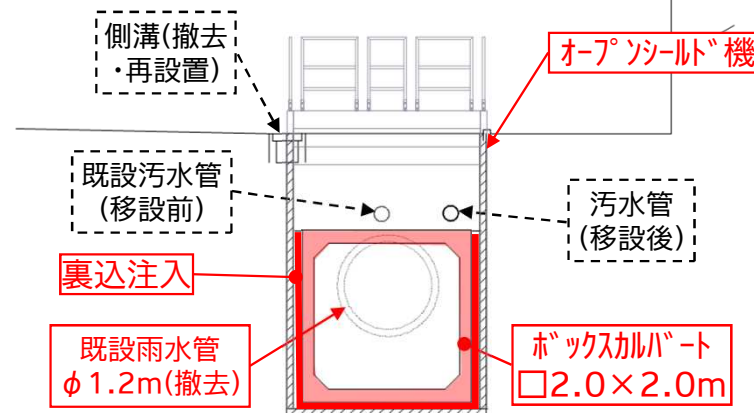

側溝(撤去・再設置)

オーブソーラー機

既設污水管
(移設前)

污水管
(移設後)

裏込注入

既設雨水管
φ1.2m(撤去)

ボックスカバート
□2.0×2.0m
