


赤木貯留管築造工事 工事状況

令和3年3月末 進捗率 約89%

3月は、立坑No.1の仮設防音ハウス解体・撤去、立坑No.3から貯留管への接続(推進工法)、立坑No.5の掘削・土留及び立坑No.7の地盤改良(薬液注入)に着手しました。
4月は、引き続き、立坑No.5の掘削・土留及び立坑No.7の地盤改良を行い、No.7の掘削・土留に着手します。



立坑No.3

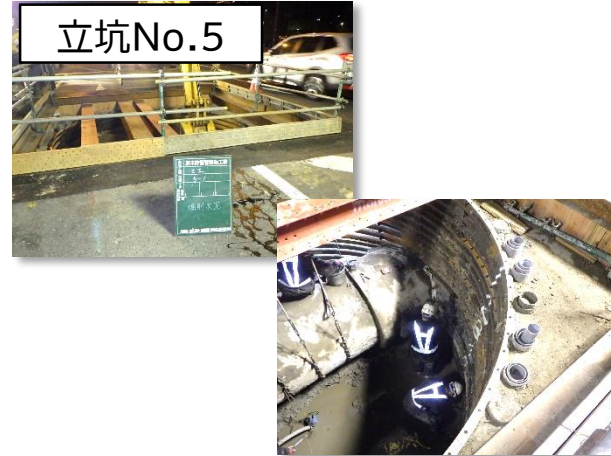


立坑No.5



立坑No.7



立坑No.1 (仮設防音ハウス)

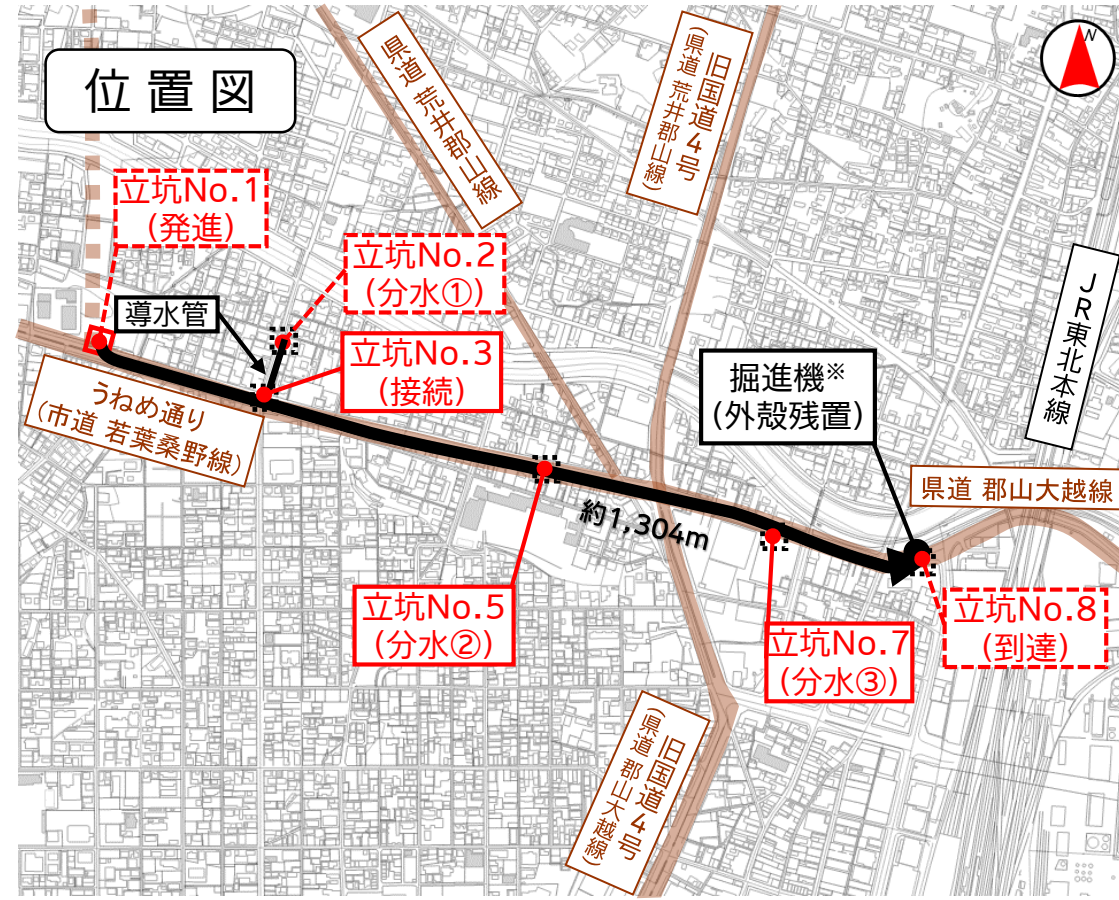

掘進機※……地中を掘り進むための機械。
