

赤木貯留管築造工事 工事状況

令和2年8月末 進捗率 約44%

8月は、シールド掘進機による本掘進(約499m完了)及び到達立坑No.8の仮設土留設置、導水管築造(推進工法)に係る立坑No.2の地盤改良、立坑No.3の仮設土留・掘削を行いました。

9月は、引き続き、シールド掘進機による本掘進及び立坑No.2、No.3、No.8の土留・掘削等を行います。



貯留管内部

シールド掘進機による掘進状況(セグメント※設置)



立坑No.2

地盤改良(薬液注入)状況




立坑No.3

仮設土留(鋼製ケーシング圧入)・掘削状況



立坑No.8

仮設土留(鋼矢板)設置状況

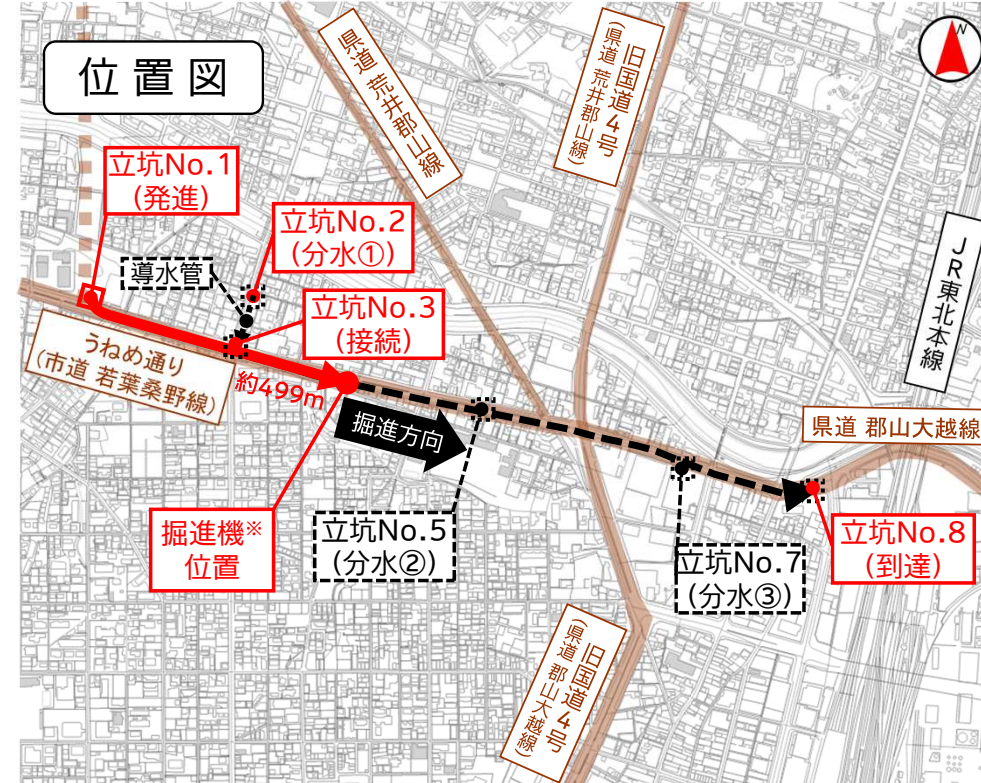

掘進機※…地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。
