

# 赤木貯留管築造工事 工事状況

令和2年7月末 進捗率 約39%

7月は、シールド掘進機※による本掘進に向けた段取替え作業が完了し、本掘進に着手(約297m完了)し、到達立坑No.8の覆工板設置及び仮設土留(鋼矢板)設置を行い、立坑No.2の地盤改良(薬液注入)に着手しました。8月は、引き続き、シールド掘進機による本掘進及び立坑No.2の地盤改良、立坑No.8の鋼矢板設置を行います。



シールド掘進機による掘進状況(汚泥搬出)




シールド掘進機による掘進状況(セグメント※設置完了)



地盤改良(薬液注入)状況



覆工板設置及び仮設鋼矢板設置状況

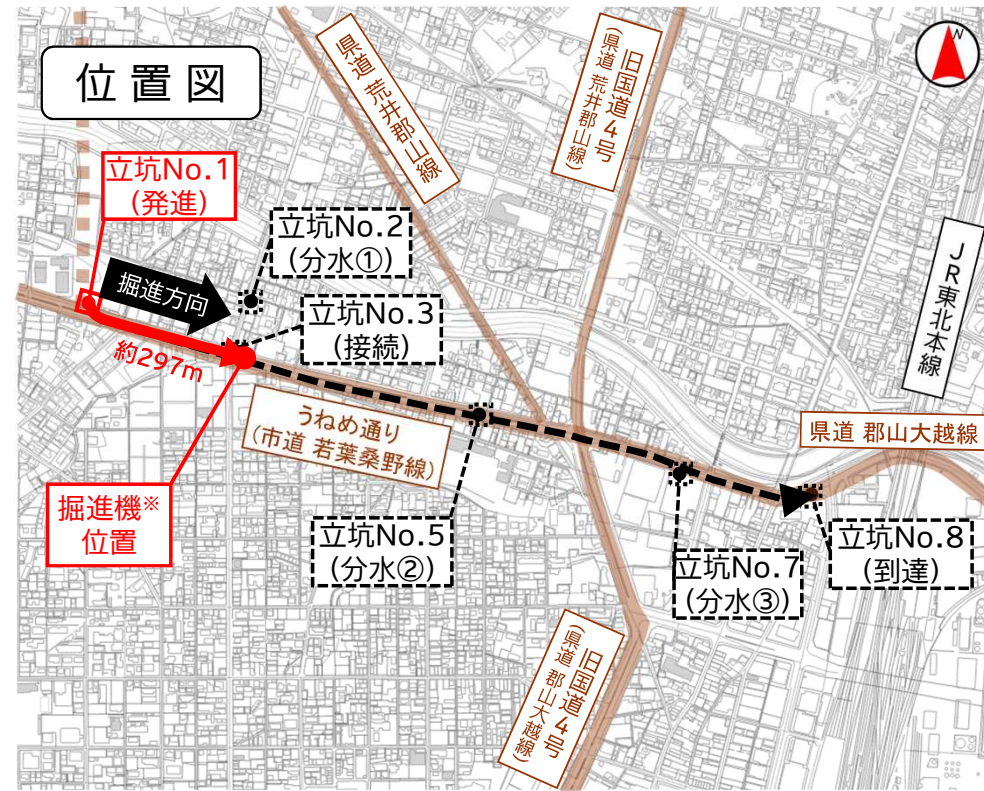

掘進機※…地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。
