

# 赤木貯留管築造工事 工事状況

令和2年6月末 進捗率 約36%


6月は、シールド掘進機※による初期掘進が完了(約83m)し、本掘進に向けた段取替え作業に着手しました。7月は、引き続き、段取替え作業を行い、シールド掘進機による本掘進に着手します。




シールド掘進機による掘進状況(セグメント※設置)




シールド掘進機による掘進状況(汚泥搬出)

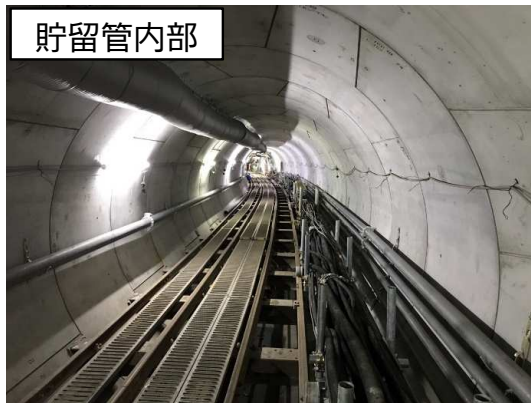

シールド掘進機による初期掘進完了

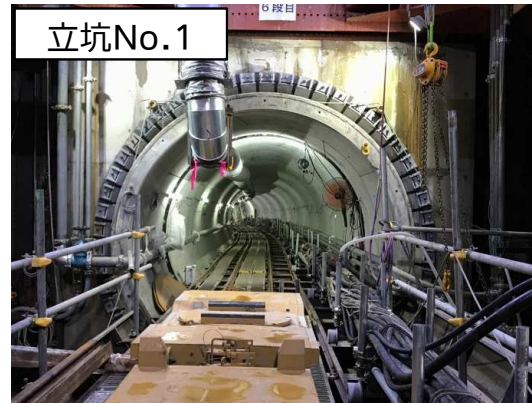

仮セグメント撤去完了

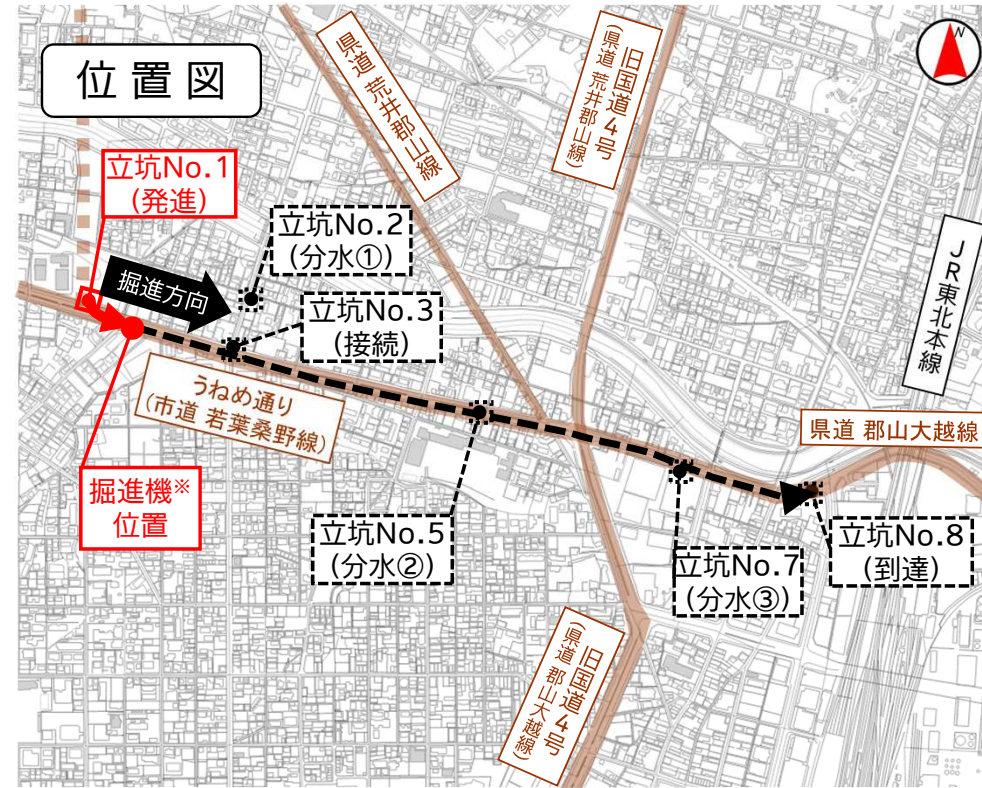

掘進機※…地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。
