

赤木貯留管築造工事 工事状況

令和2年1月末 進捗率 約11%

1月は、仮設防音ハウスの基礎工を行い、シールド掘進機※を発進するための坑口工及び発進架台設置、掘進機組立に係る設備の搬入・設置等に着手しました。

2月は、引き続き、掘進機に係る設備の搬入・設置等を行い、シールド掘進機の分割搬入・組立等に着手します。

立坑No.1



仮設防音ハウス基礎工状況

立坑No.1



坑口工及び発進架台設置状況

立坑No.1




坑口工及び発進架台設置状況

工場内(大阪市)



シールド掘進機仮組完了状況(工場検査)

位置図

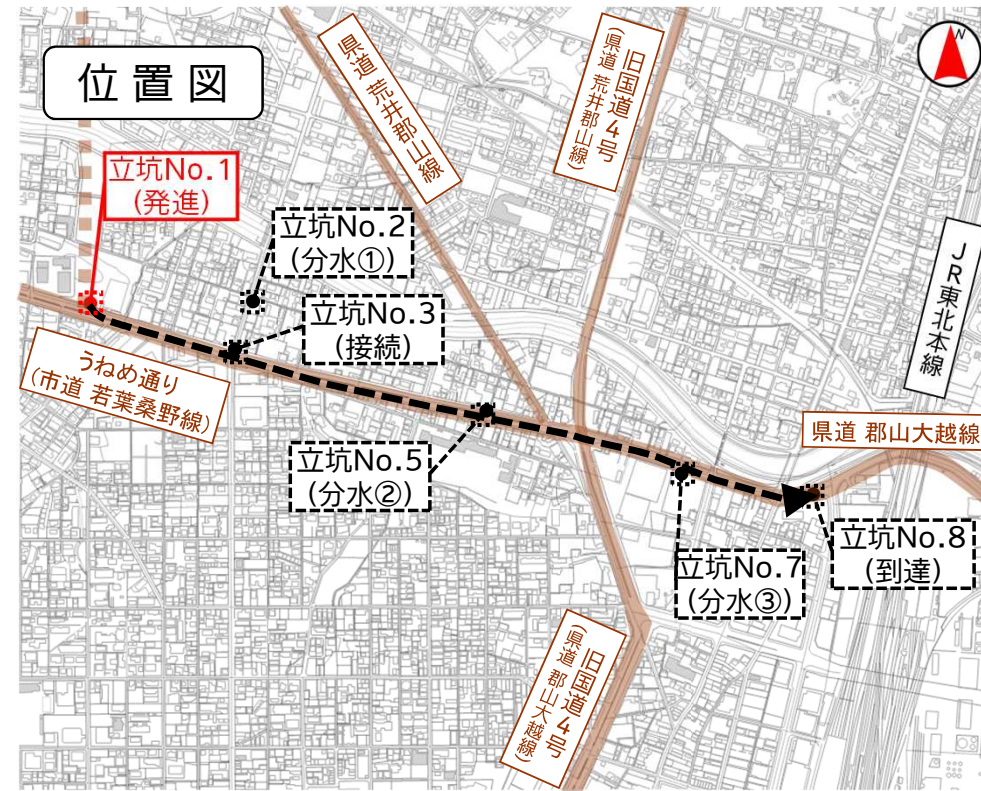

掘進機※…地中を掘り進むための機械。
