

# 赤木貯留管築造工事 工事状況

令和元年12月末 進捗率 約10%

12月は、立坑No.1の掘削・支保工を完了させ、立坑内の底盤コンクリート打設及び仮設防音ハウスの基礎工等に着手しました。

1月は、引き続き、仮設防音ハウスの基礎工を行い、シールド掘進機※を発進するための坑口工に着手します。



掘削・支保工完了状況




底盤コンクリート打設状況



底盤コンクリート打設完了状況



シールド掘進機※仮組立状況(検査立会時)

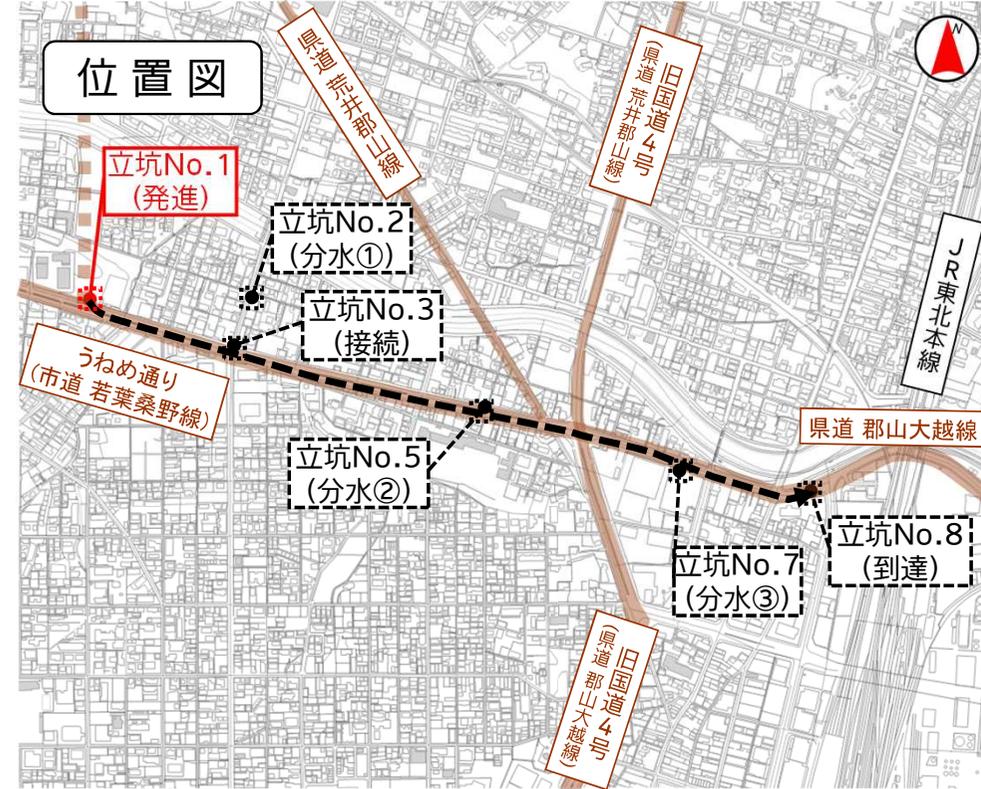

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。

掘進機※…地中を掘り進むための機械。
