

図景貯留管築造工事 工事状況

令和3年3月末 進捗率 約92%

3月は、立坑No.2の特殊人孔の築造及び仮設防音ハウス基礎の撤去等を行い、立坑No.3の特殊人孔築造のための仮設土留設置に着手しました。

4月は、立坑No.2特殊人孔築造を行い、立坑No.3の掘削・支保工及び立坑No.1特殊人孔築造に着手します。

立坑No.2



特殊人孔築造(配筋・コンクリート打設)状況

立坑No.3



仮設土留設置状況

立坑No.1
(仮設防音ハウス)




仮設防音ハウス基礎撤去状況

立坑No.1
(仮設防音ハウス)



仮設防音ハウス基礎撤去完了状況

位置図

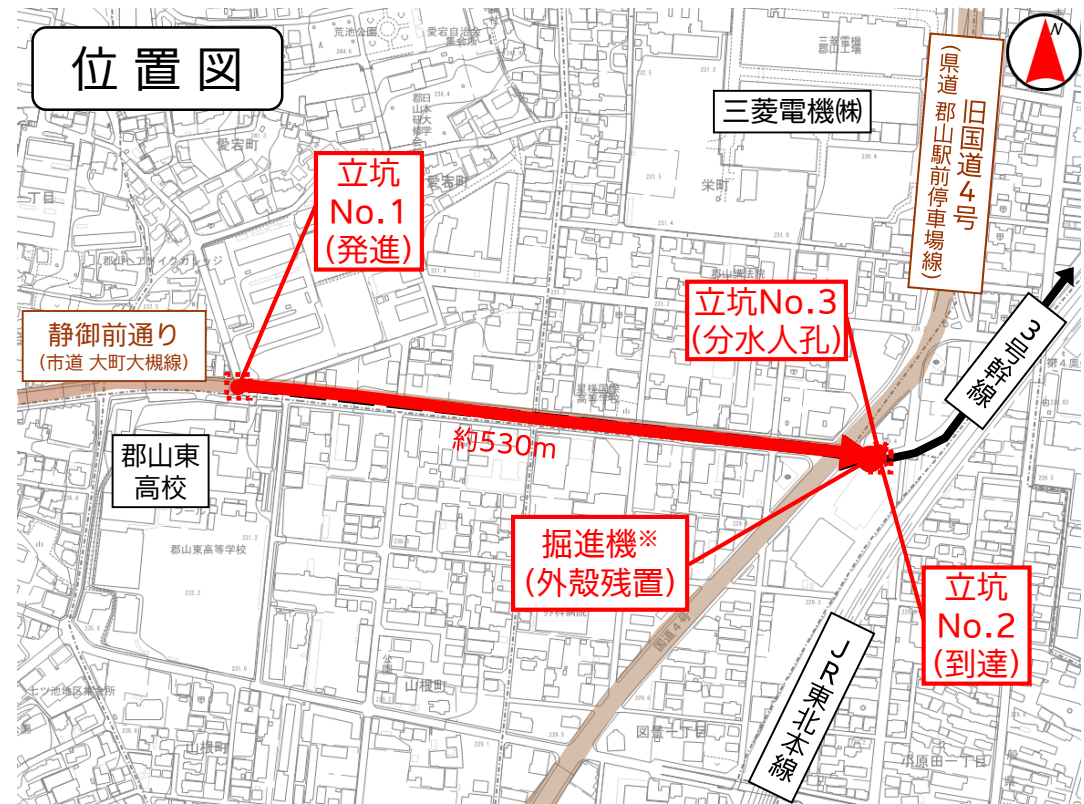

掘進機※…地中を掘り進むための機械。
