

風景貯留管築造工事 工事状況

令和3年2月末 進捗率 約90%

2月は、立坑No.2の特殊人孔の築造及び仮設防音ハウス建屋の解体・撤去等を行いました。
3月は、引き続き、立坑No.2の特殊人孔の築造及び仮設防音ハウス基礎の撤去等を行います。



立坑No.2

特殊人孔築造(配筋)状況



立坑No.2

特殊人孔築造(コンクリート打設)状況




立坑No.1
(仮設防音ハウス)

仮設防音ハウス(建屋)解体・撤去状況



立坑No.1
(仮設防音ハウス)

仮設防音ハウス(建屋)撤去完了状況

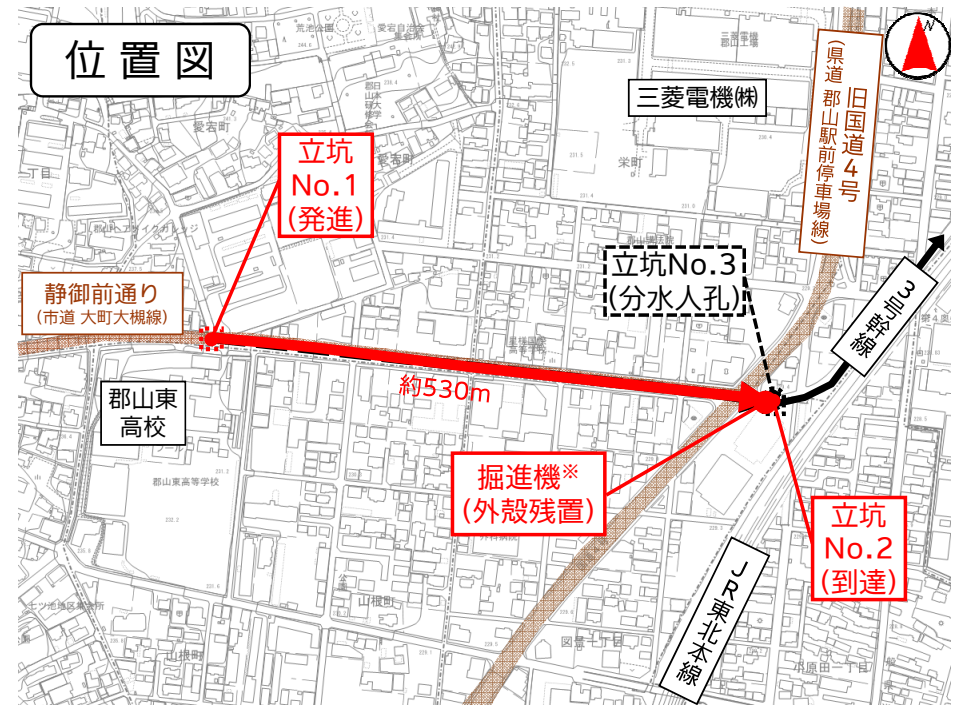

位置図

立坑No.1
(発進)

立坑No.3
(分水人孔)

掘進機*
(外殻残置)

立坑No.2
(到達)

掘進機*…地中を掘り進むための機械。
