

図景貯留管築造工事 工事状況

令和2年9月末 進捗率 約73%

9月は、シールド掘進機※による本掘進(約443m完了)を行いました。
10月は、引き続き、シールド掘進機による本掘進を行い、立坑No.2まで到達する予定です。



立坑No.1
(仮設防音ハウス)

セグメント※搬入保管状況



貯留管内部

シールド掘進機による掘進状況(セグメント設置)




貯留管内部

シールド掘進機による掘進状況(掘進機の操作管理)



貯留管内部

シールド掘進機による掘進状況(セグメント設置完了)

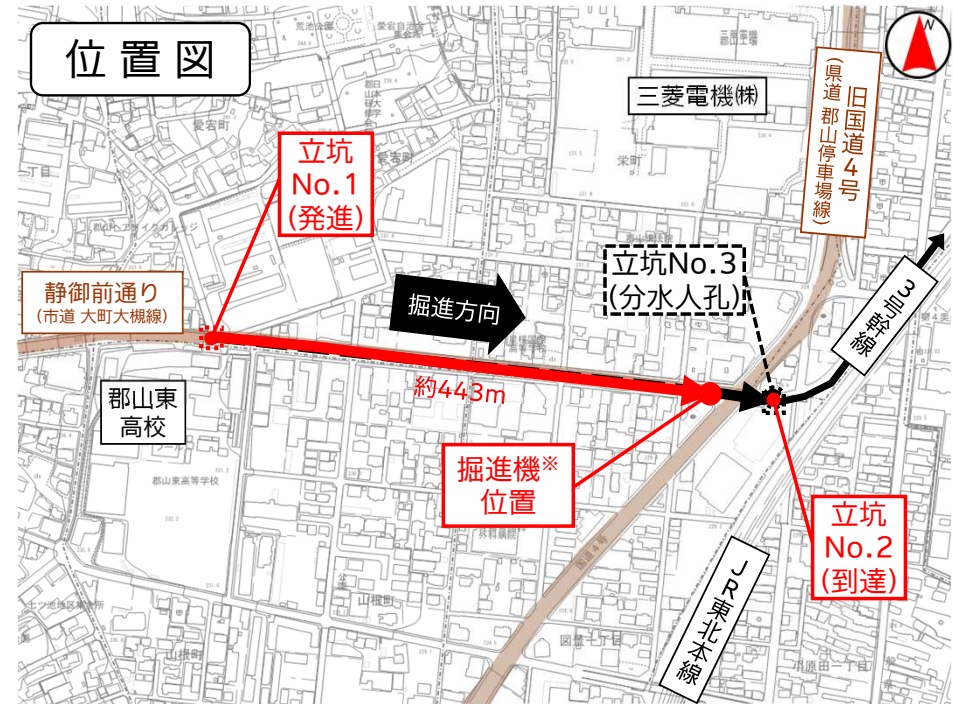

掘進機※…地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。
