

# 函景貯留管築造工事 工事状況

令和2年6月末 進捗率 約52%

6月は、シールド掘進機※による初期掘進が完了(約70m)し、本掘進に向けた段取替え作業及び立坑No.2の掘削に着手しました。

7月は、引き続き、段取替え作業等を行い、シールド掘進機による本掘進に着手します。



立坑No.1

仮セグメント

セグメント※搬入状況



貯留管内部

シールド掘進機による初期掘進完了




立坑No.1

仮セグメント撤去完了



立坑No.2

掘削・支保状況

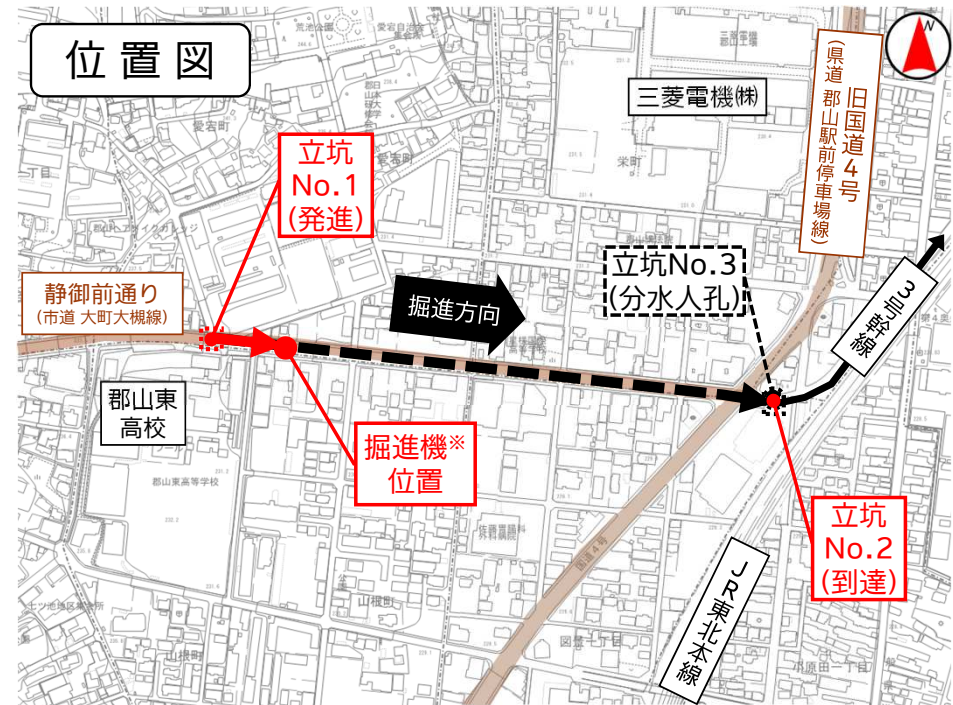

掘進機※…地中を掘り進むための機械。

セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。
