

函景貯留管築造工事 工事状況


令和2年5月末 進捗率 約48%

5月は、鏡切(掘進機挿入部鋼矢板壁撤去)を行い、シールド工事の初期掘進(セグメント※設置)を開始しました。6月は、引き続き、シールド工事の初期掘進を行い、立坑No.2の掘削に着手します。




立坑No.1

鏡切(鋼矢板壁撤去)状況

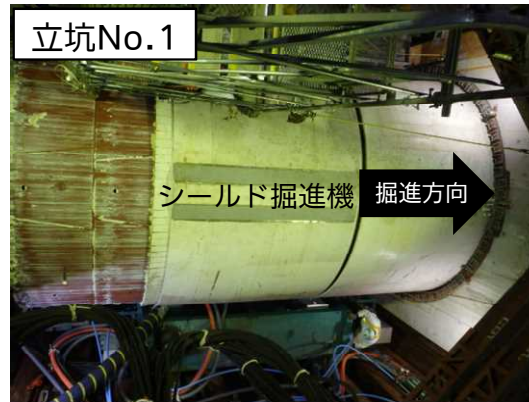


立坑No.1

シールド掘進機※による掘進状況

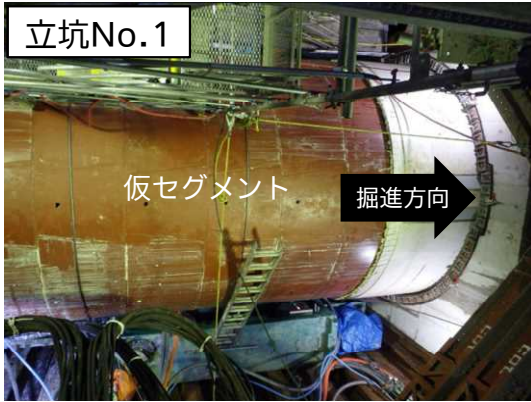


立坑No.1

シールド掘進機※による掘進状況

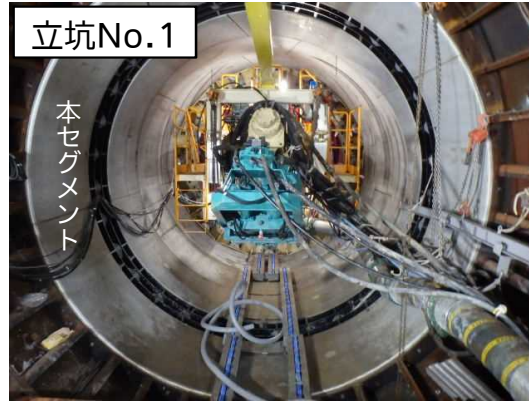

立坑No.1

セグメント※設置状況

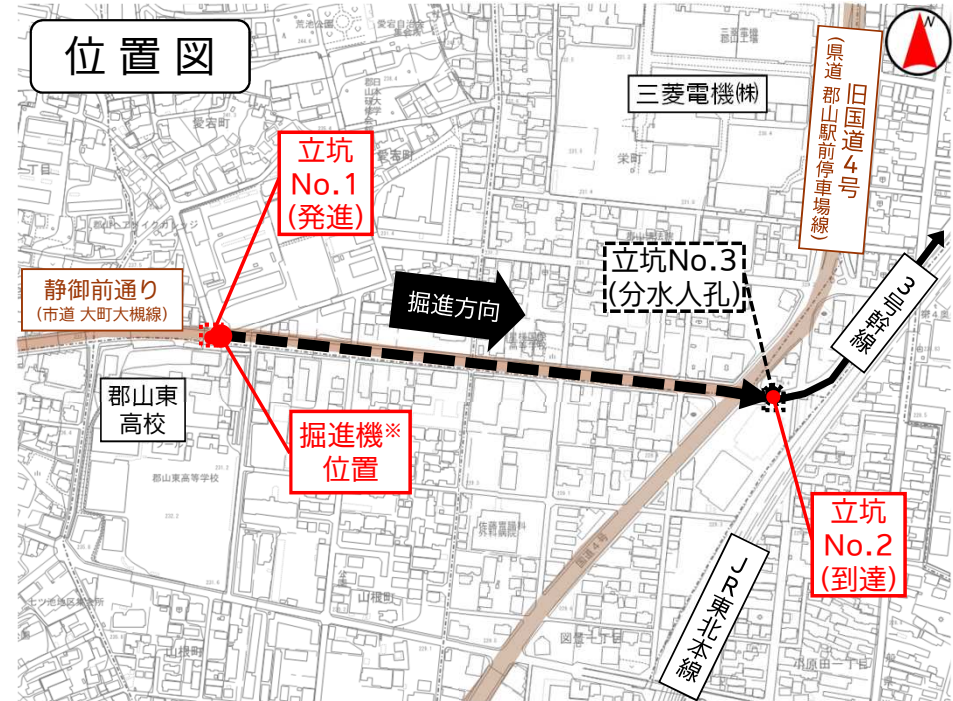

位置図

掘進機※...地中を掘り進むための機械。

セグメント※...シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。
