
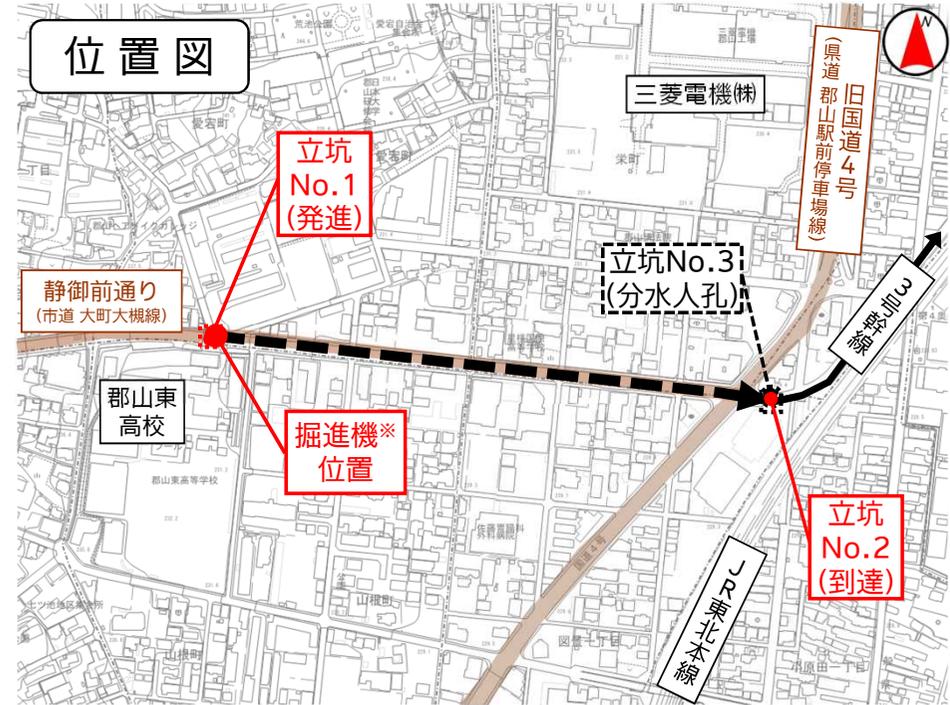
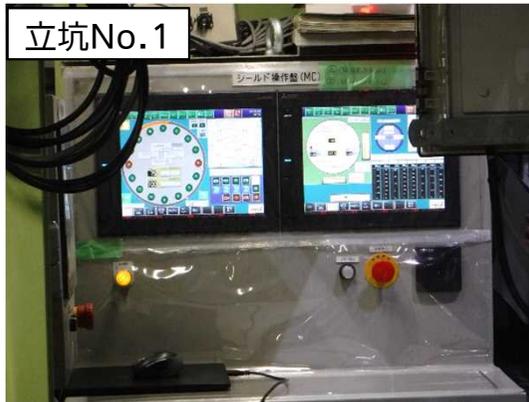


# 図景貯留管築造工事 工事状況

令和2年4月末 進捗率 約46%

4月は、到達立坑No.2の地盤改良、仮設防音ハウス(立坑No.1)内の各種設備及びシールド掘進機の調整・総合試運転等を行い、シールド工事の掘進開始の準備を行いました。  
5月は、鏡切(掘進機挿入部鋼矢板壁撤去)を行い、シールド工事の掘進を開始します。

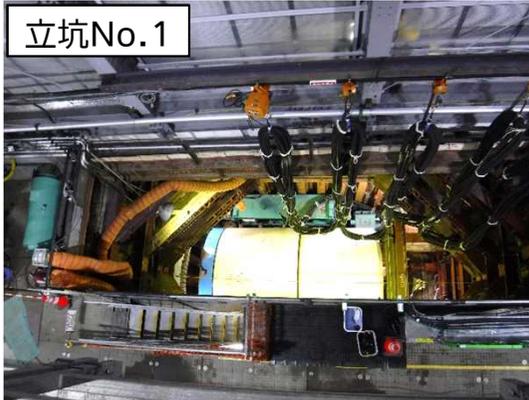

掘進機\*…地中を掘り進むための機械。

セグメント\*…シールド掘進機\*で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。
