

## 図景貯留管築造工事 工事状況

令和元年11月末 進捗率 約20%


11月は、立坑No.1からシールド工事用掘進機を発進するための坑口工を行いました。  
12月は、立坑No.1内で掘進機組立に係る設備の搬入・設置を行い、掘進機を分割して搬入し、立坑内で組立等に着手します。



坑口施工(リング搬入・設置)状況




坑口施工(コンクリート打設)状況

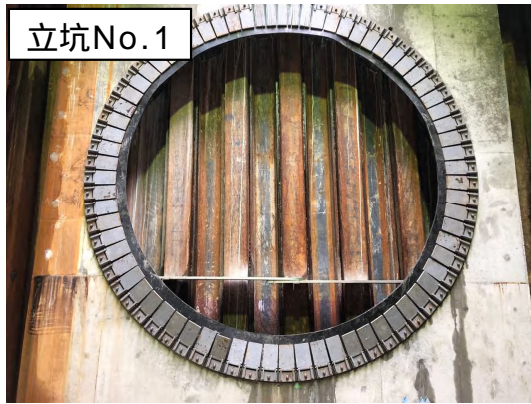

坑口施工(コンクリート打設完了)状況



工場内(横浜市) シールド掘進機仮組完了状況(工場検査)

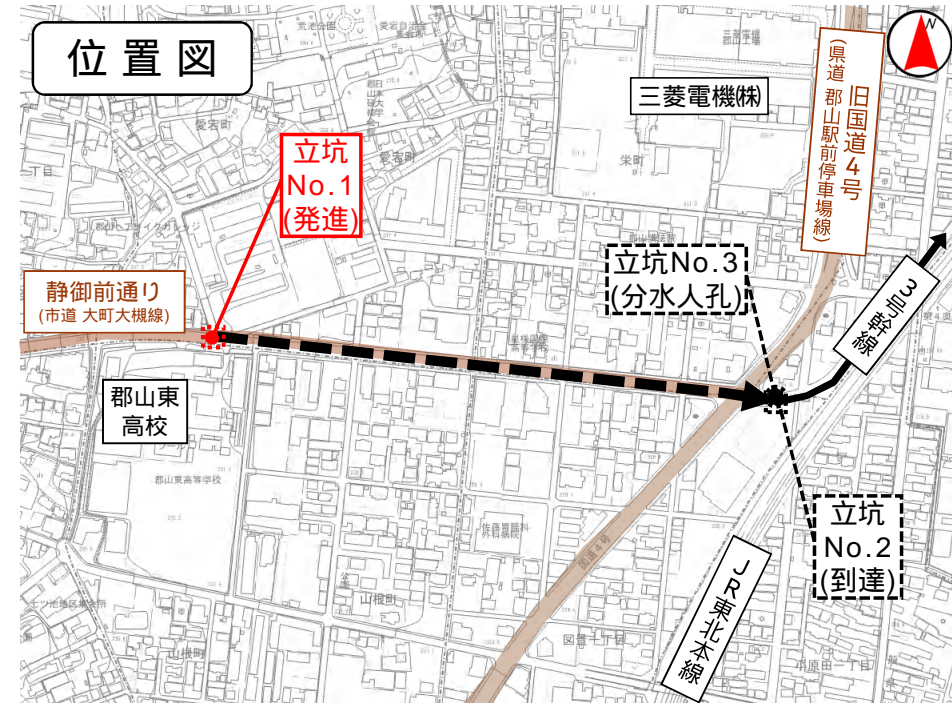

掘進機 ...地中を掘り進むための機械。
