

6号幹線放流管築造工事第2工区 工事状況

令和元年9月末 進捗率 約94%


9月は、覆工板及び仮設土留撤去、埋戻し、道路附属物の復旧を完了し、舗装の仮復旧を行いました。
10月は、舗装の本復旧を行い、第2工区のすべての工事が完了する予定です。



仮設土留撤去(鋼矢板引抜き)状況



下層路盤(転圧)完了状況

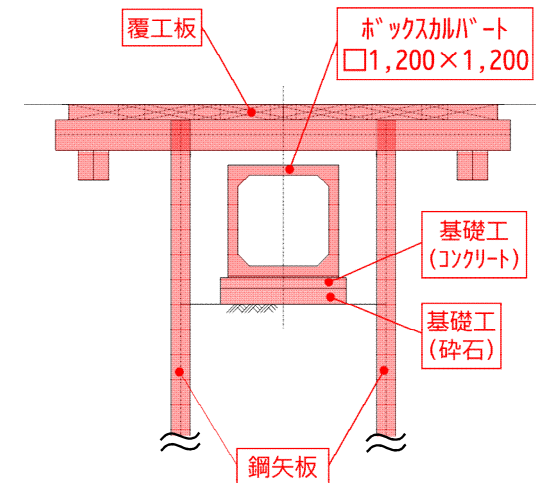

上層路盤(転圧)状況



舗装仮復旧状況



ボックスカバート布設完了(内部)状況(8月末)
