



小原田貯留管築造工事 工事状況

令和3年5月末 進捗率 約34%

5月は、シールド掘進機※による本掘進のための段取り替え及び本掘進(セグメント※設置)(施工延長約188m完了)を行い、到達立坑No.2の掘削・支保工、基礎工(砕石・コンクリート打設)を行いました。
6月は、引き続き、シールド掘進機による本掘進等を行います。

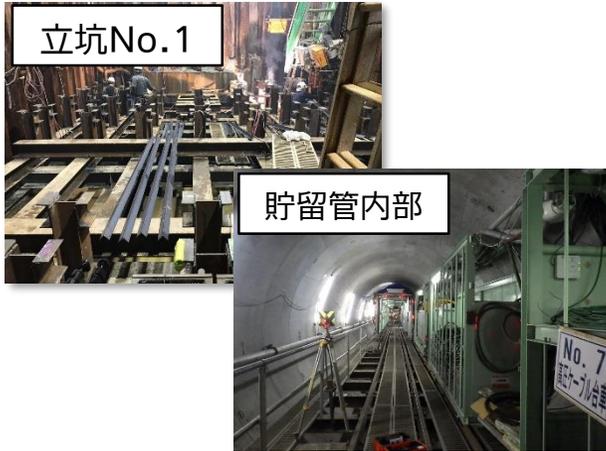

本掘進のための段取り替え作業状況

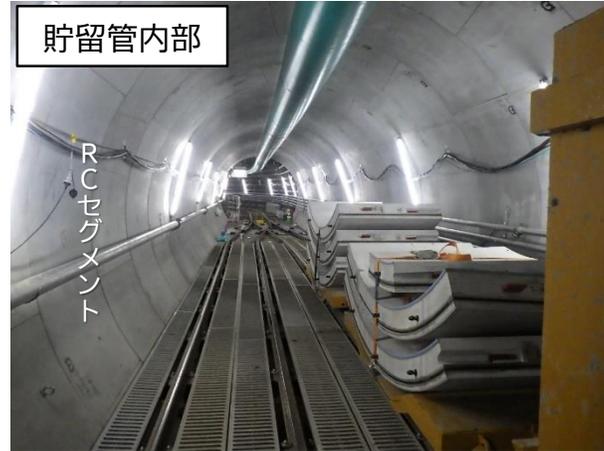

シールド掘進機による掘進(セグメント運搬)状況



掘削・支保工、基礎砕石転圧状況



基礎コンクリート打設状況

