



小原田貯留管築造工事 工事状況

令和3年4月末 進捗率 約30%


4月は、シールド掘進機※による初期掘進(セグメント※設置)(施工延長約140m完了)及び本掘進に向けた段取り替え、立坑No.2の掘削・支保工を行いました。
5月は、引き続き、本掘進に向けた段取り替え等を行い、シールド掘進機による本掘進に着手します。

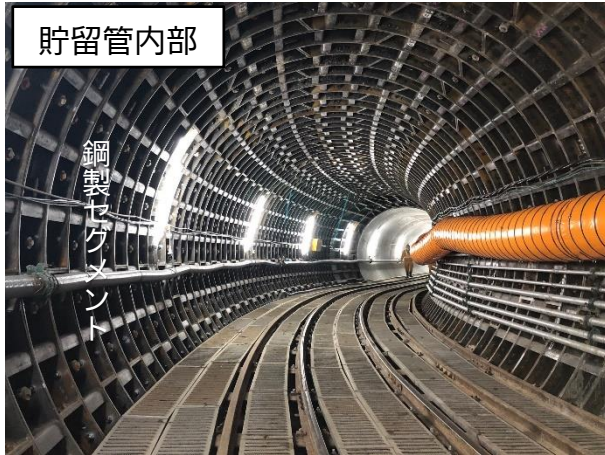

シールド掘進機による掘進(セグメント設置)状況

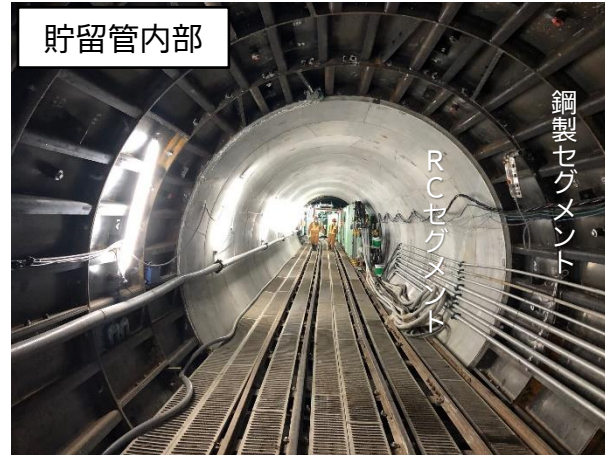


シールド掘進機による掘進(セグメント設置)状況

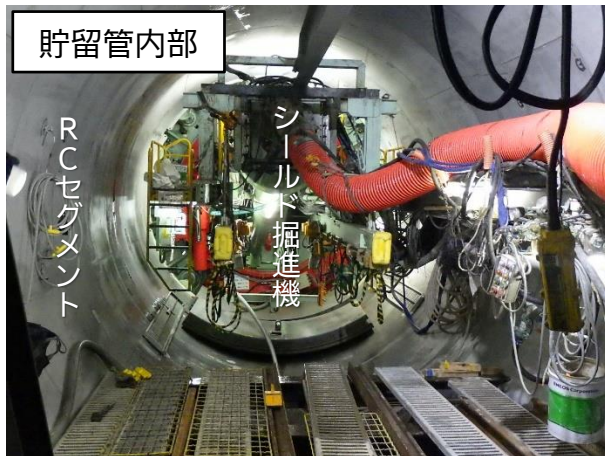

シールド掘進機による掘進(セグメント設置)状況



掘削・支保工状況

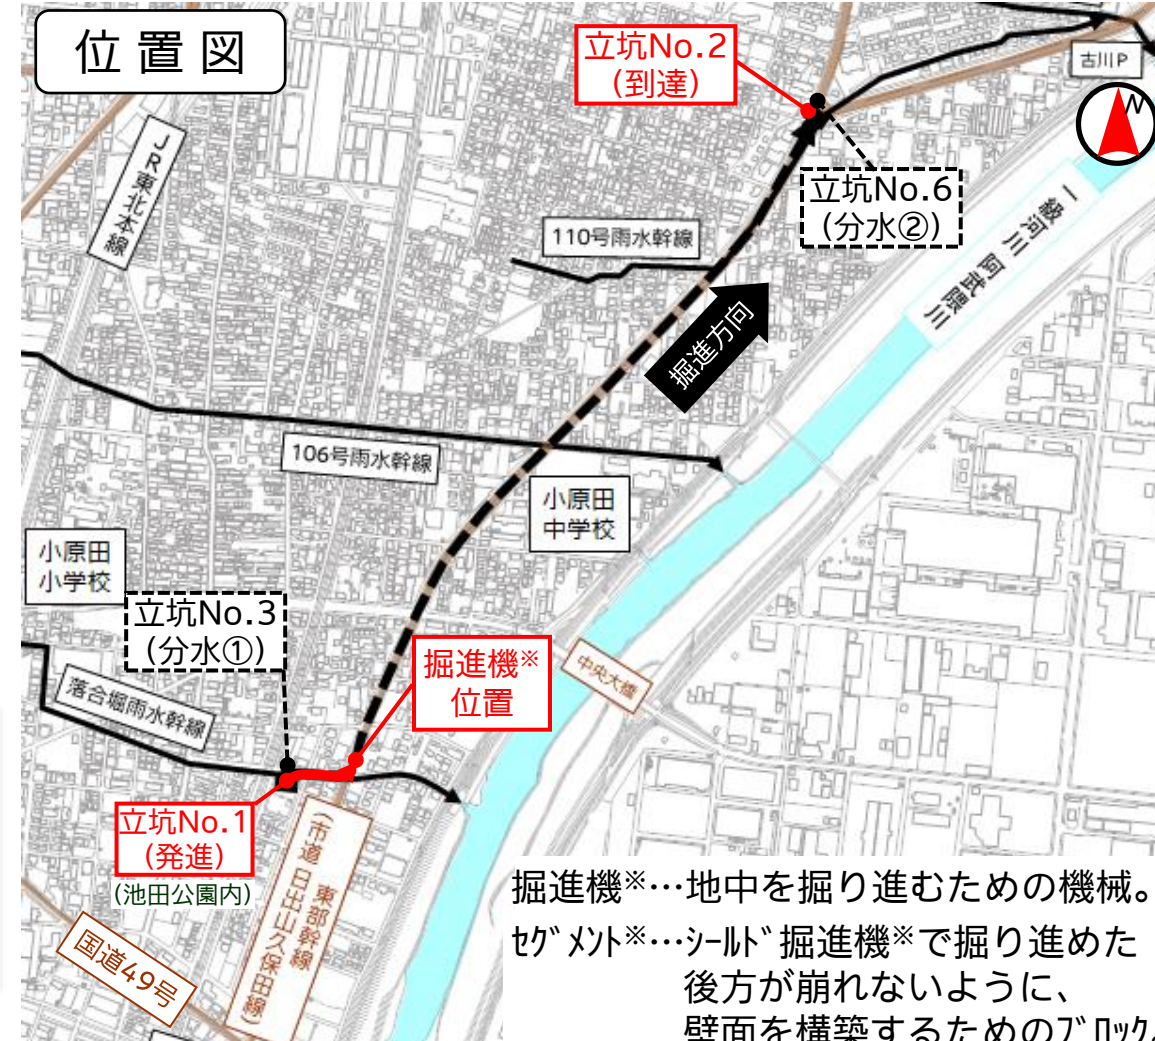

掘進機※…地中を掘り進むための機械。
セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。
