

小原田貯留管築造工事 工事状況

令和3年3月末 進捗率 約22%


3月は、シールド掘進機※による初期掘進(セグメント※設置)(施工延長約74m完了)を行いました。
4月は、引き続き、シールド掘進機による初期掘進を行い、本掘進に向けた段取り替えを行います。



セグメント搬入・保管状況




シールド掘進機による掘進状況

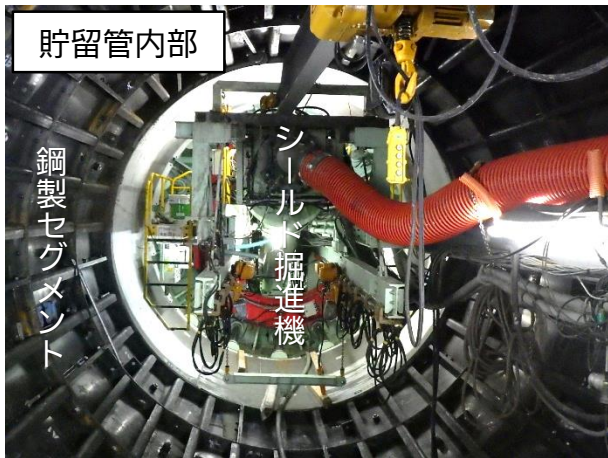

シールド掘進機※による掘進状況



シールド掘進機による掘進(汚泥搬出)状況

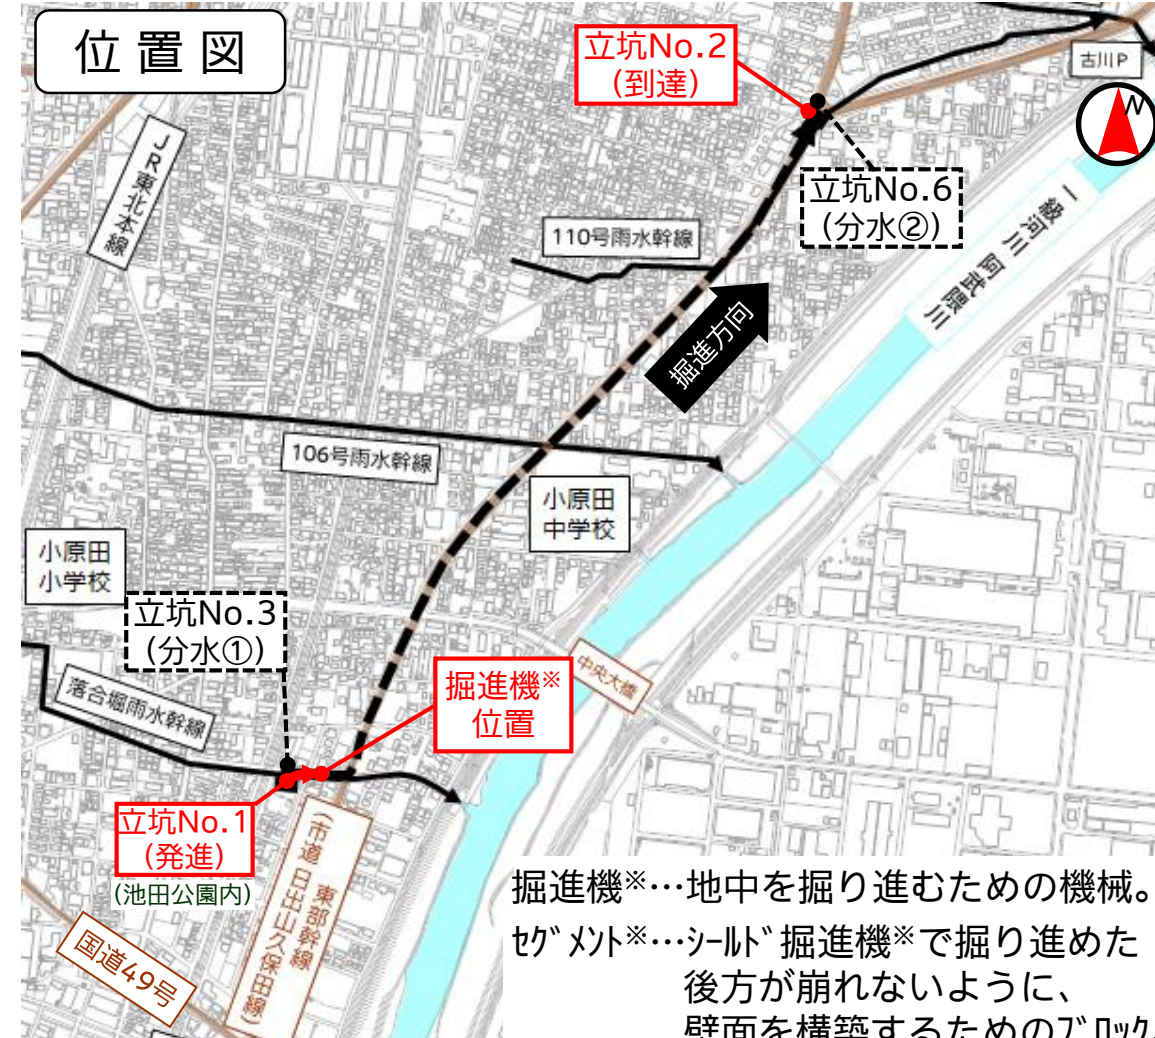

掘進機※…地中を掘り進むための機械。
セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。
