


小原田貯留管築造工事 工事状況

令和3年2月末 進捗率 約19%

2月は、鏡切(掘進機挿入部鋼矢板壁撤去)を行い、シールド工事の初期掘進(セグメント※設置)を開始しました。
3月は、引き続き、シールド工事の初期掘進(セグメント設置)を行います。



鏡切(鋼矢板切断)状況

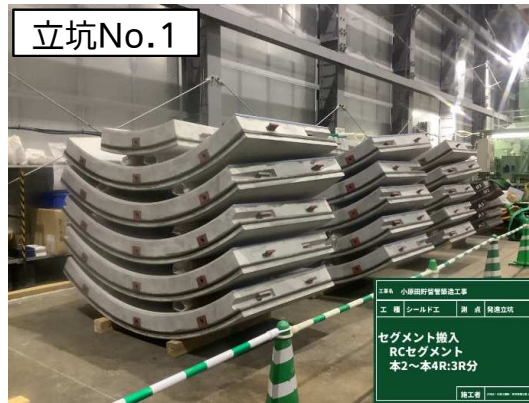

セグメント搬入保管状況(仮設防音ハウス内)



シールド掘進機※による掘進(仮セグメント設置)状況



シールド掘進機による掘進(汚泥搬出)状況

