

小原田貯留管築造工事 工事状況

令和3年1月末 進捗率 約16%

1月は、シールド掘進機※に係る仮設備の設置等を行い、立坑No.2の仮設土留及び覆工板設置等を行いました。
2月は、鏡切(掘進機挿入部鋼矢板壁撤去)を行い、シールド工事の掘進(セグメント※設置)を開始します。



立坑No.1
土砂ピット設置状況(仮設防音ハウス内)




立坑No.1
各種設備設置状況(仮設防音ハウス内)



立坑No.2
覆工板設置状況



立坑No.2
掘削・土留状況(全景)

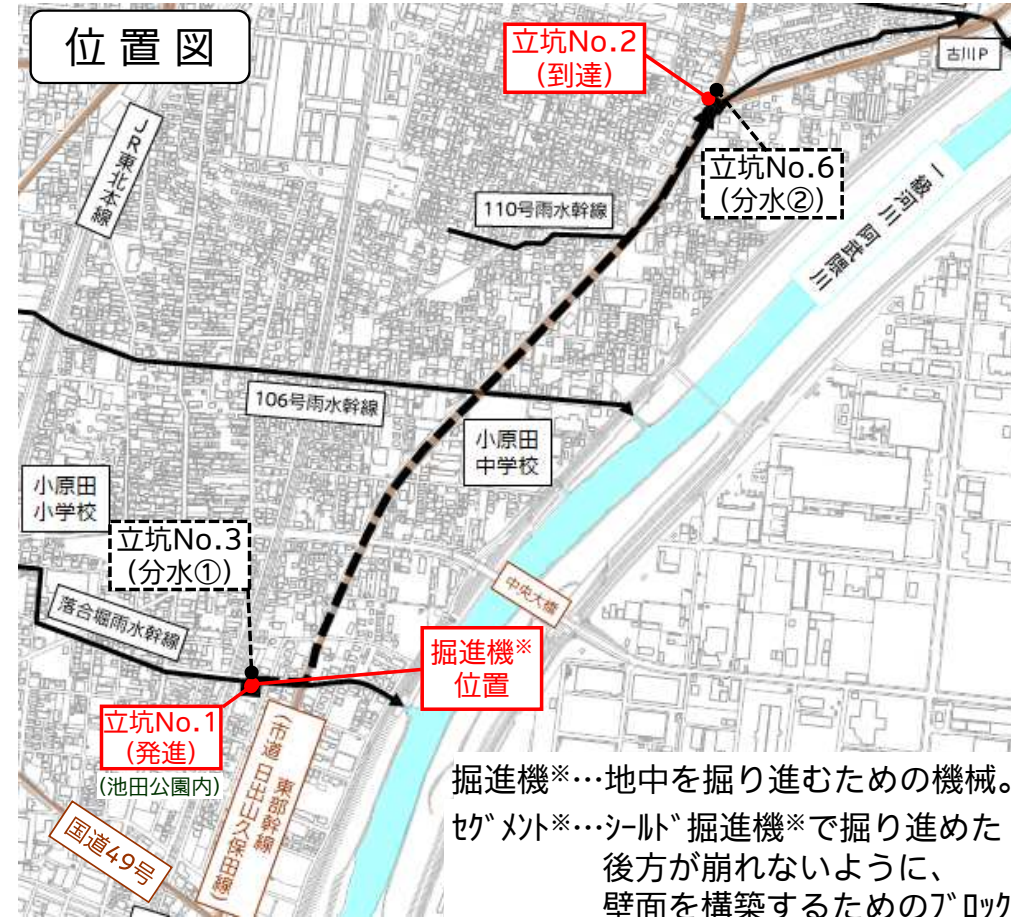

掘進機※…地中を掘り進むための機械。
セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた後方が崩れないように、壁面を構築するためのブロック。
