

下水道管理センター樋門・放流渠築造工事 工事状況

令和3年8月末 進捗率 約3%

8月は、樋門及び放流渠に係る仮設土留(鋼矢板)設置に着手しました。
9月は、引き続き、仮設土留設置を行い、樋門及び放流渠(ボックスカット設置)に係る掘削・支保工、基礎工に着手します。



仮設土留(鋼矢板)設置状況(北側を望む)




仮設土留(鋼矢板)設置状況(逢瀬川堤防側)



仮設土留(鋼矢板)設置状況(逢瀬川堤防より南側を望む)



仮設土留(鋼矢板)設置状況(逢瀬川堤防側)

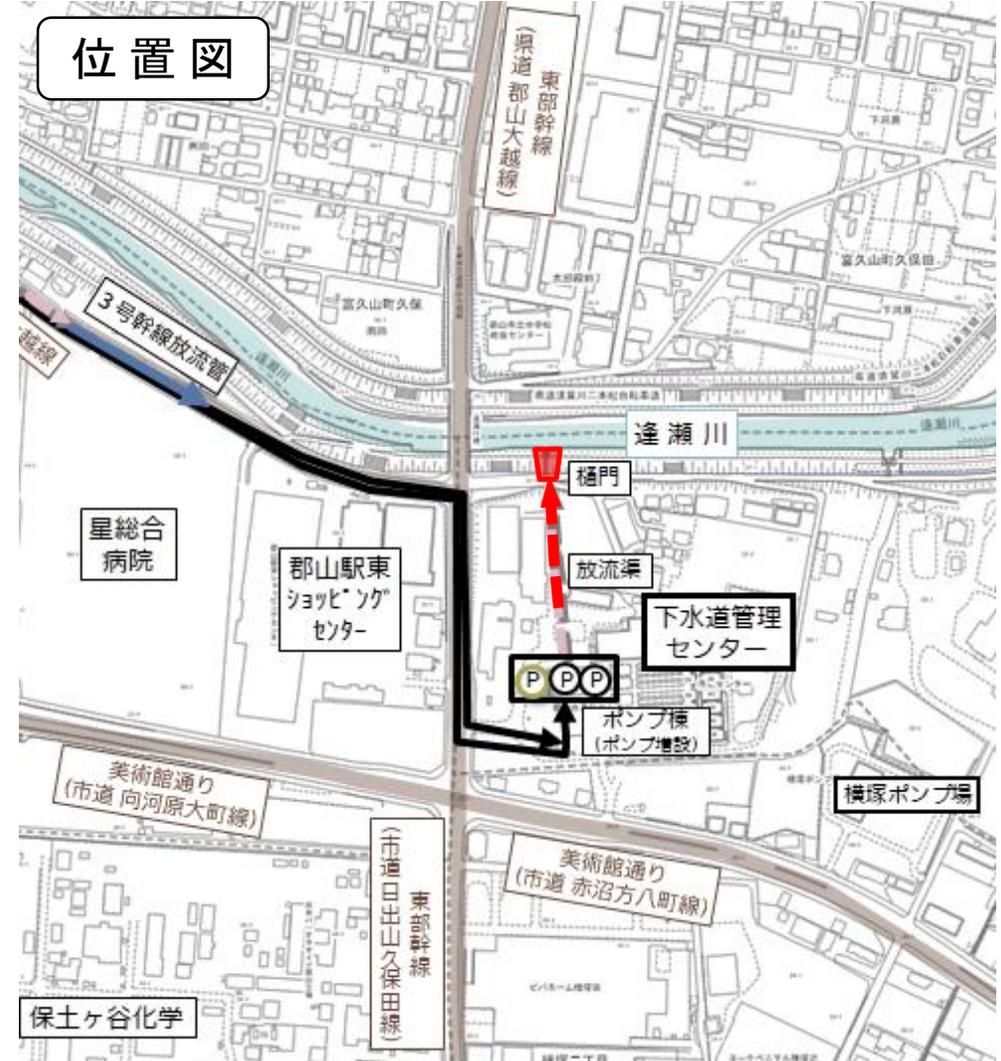

位置図
